



República da Guiné-Bissau  
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO  
RURAL

FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
AGRÍCOLA

**PROJECTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAS REGIÕES DO SUL**

**PADES**

Sede em Buba

C.P. Nº 71 – Bissau – Guiné-Bissau - Tel. (245) 96 668 88 95/95 529 80 77 – E-mail: [pades.fidagb2016@gmail.com](mailto:pades.fidagb2016@gmail.com)/[adelinocorreia@yahoo.com.br](mailto:adelinocorreia@yahoo.com.br)

---

# **RAPPORT D'ACTIVITÉS ANNUEL**

---

## **Nº 02**

**PÉRIODE DU RAPPORT**

**JANVIER - DÉCEMBRE 2018**

**DÉCEMBRE 2018**

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>LISTE DES TABLEAUX .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>LISTE DES FIGURES.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>RÉSUMÉ.....</b>	<b>- 5 -</b>
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PADES.....</b>	<b>- 12 -</b>
<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>13</b>
<b>1ÈRE PARTIE.....</b>	<b>14</b>
<b>EXÉCUTION PHYSIQUE DES ACTIVITÉS.....</b>	<b>14</b>
<b>I. APERÇU SUR LES RECOMMANDATIONS DE MISSION DE LA RMP .....</b>	<b>15</b>
<b>II. SITUATION DE L'EXÉCUTION DES ACTIVITÉS.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 COMPOSANTE A : APPUI A LA PRODUCTION ET PRODUCTIVITE RIZICOLE ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES</b>	<b>15</b>
<b>2.1.1 Sous-composante A1 : Réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.1.1 Volet A1 : Réhabilitation des aménagements en zones de mangrove et basfonds .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.2 Sous-composante A2 : Exploitation des sites et développement des activités complémentaires .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.2.1 Volet A22 : Appui à l'élevage à cycles courts et maraîchage.....</b>	<b>23</b>
<b>2.1.2.2 Volet A23 : Appui à la structuration des OP et à la plateforme nationale .....</b>	<b>23</b>
<b>2.1.2.3 Volet A24 : Renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre.....</b>	<b>25</b>
<b>2.2 COMPOSANTE B : APPUI A LA VALORISATION DES PRODUCTION ET ACCES AU MARCHÉ .....</b>	<b>27</b>
<b>2.2.1 Sous-composante B1 : Promotion de métiers connexes et d'activités de valorisation post-récolte .....</b>	<b>27</b>
<b>2.2.2 Sous-composante B2 : Construction et réhabilitation de pistes rurales .....</b>	<b>27</b>
<b>2.3 COMPOSANTE C : COORDINATION ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL .....</b>	<b>28</b>
<b>2.3.1 Sous-composante C1 : Coordination et suivi-évaluation.....</b>	<b>29</b>
<b>2.3.1.1 Volet C11 : Rénovation et construction de bureaux.....</b>	<b>29</b>
<b>2.3.1.2 Volet C12 : Coordination et suivi-évaluation.....</b>	<b>29</b>
<b>2.3.1.3 Volet C14 : Acquisition du matériel/outils informatiques.....</b>	<b>32</b>
<b>2.3.1.4 Volet C15 : Étude thématique.....</b>	<b>33</b>
<b>2.3.1.5 Volet C16 : Formation et voyage d'échanges.....</b>	<b>36</b>
<b>2.3.2 Sous-composante C2 : Mise à échelles des CDIT.....</b>	<b>37</b>
<b>2.3.2.1 Volet C21 : Amélioration et extension des CDIT.....</b>	<b>37</b>
<b>III. ANALYSE DES RESULTATS ATTEINTS .....</b>	<b>39</b>
<b>IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS PROPOSÉES .....</b>	<b>40</b>
<b>2ÈME PARTIE .....</b>	<b>41</b>
<b>EXÉCUTION FINANCIÈRE .....</b>	<b>41</b>
<b>V. SITUATION DE L'EXÉCUTION DE LA PASSATION DES MARCHÉS .....</b>	<b>42</b>
<b>VI. SITUATION DES DÉCAISSEMENTS DU DEUXIÈME SEMESTRE .....</b>	<b>43</b>
<b>6.1 DEMANDES DE DECAISSEMENT TRAITÉES AU COURS DE PREMIER SEMESTRE .....</b>	<b>43</b>
<b>6.2 DEMANDES DE DECAISSEMENT PAYÉES AU COURS DE L'ANNEE .....</b>	<b>44</b>
<b>VII. SITUATION DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE.....</b>	<b>44</b>

<b>7.1</b>	<b>EXECUTION BUDGETAIRE PAR COMPOSANTE .....</b>	<b>44</b>
<b>7.2</b>	<b>EXECUTION BUDGETAIRE PAR CATEGORIE DE DEPENSES .....</b>	<b>44</b>
<b>7.3</b>	<b>EXECUTION BUDGETAIRE PAR NATURE DE DEPENSES .....</b>	<b>45</b>
<b>7.4</b>	<b>EXECUTION BUDGETAIRE PAR SOURCE DE FINANCEMENT .....</b>	<b>46</b>
<b>7.5</b>	<b>SITUATION DES COMPTES BANCAIRES DU PROJET .....</b>	<b>46</b>
<b>7.5.1</b>	<i>Situation du compte spécial.....</i>	<i>46</i>
<b>7.5.2</b>	<i>Situation du compte contrepartie de l'État .....</i>	<i>46</i>
<b>7.6</b>	<b>CONCLUSION SUR LA GESTION DE DEUXIEME SEMESTRE .....</b>	<b>46</b>
<b>VIII.</b>	<b>CONCLUSION GÉNÉRALE.....</b>	<b>47</b>
<b>ANNEXES.....</b>		<b>48</b>
<b>QUINARA.....</b>		<b>56</b>

## **LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES**

AAAC	Autorité d'Évaluation Environnementale Compétente
AHA	Aménagement Hydro-Agricole
AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
AP	Agro Pastoral
APD	Avant-Projet Détaillé
APP	Avant-Projet Participatif
APS	Avant-Projet Sommaire
APPRAC	Appui à la production et productivité rizicole et activités complémentaires
AU	Association d'Usagers
CDIT	Comité de Développement Intégré des Tabancas
CGB	Comité de Gestion des Bolanhas
CGP	Comité de Gestion des Périmètres
CITEP	Comité Inter-villageois d'Entretiens des Pistes
CNP	Comité National de Pilotage
DENARP II	Document Stratégie Nationale de la Réduction de la Pauvreté
DGFF	Direction Générale de Forêts et Faunes
DGIDR	Direction Générale d'Ingénierie et Développement Rural
DGIT	Direction Générale d'Infrastructures de Transport
DPD	Demandes de Paiement Directe
DRA	Direction Régionale de l'Agriculture
DRF	Demandes de Retrait de Fonds
DRH	Direction des Ressources Hydriques
FIDA	Fonds International de Développement Agricole
FIDL	Fonds d'Initiative de Développement Local
MADR	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MEF	Ministère de l'Économie et des Finances
NAPA	Plan d'Action National de l'Adaptation aux Changements Climatiques
OBP	Organisation de Base des Paysans
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OPB	Organisation des Producteurs de la Base
PADES	Projet d'Appui au Développement Économique des Régions du Sud
PPM	Plan de Passation du Marche
PNIA	Programme National d'Investissement Agricole
PRRDC	Projet de Réhabilitation Rurale et de Développement Communautaire
PTBA	Plan du Travail et Budget Annuel
SSE	Système du Suivi et Évaluation
SYGRI	Système de Gestion des Résultats et d'Impact
UCP	Unité de Coordination du Projet

## **LISTE DES TABLEAUX**

Tableau 1 : Résumé du PADES _____	- 12 -
Tableau 2 : Situation de l'exécution du PPM (Janvier - Décembre 2018) _____	42
Tableau 3: DRF / DPD traités et soumis au bailleur en 2018 _____	43
Tableau 4 : Aperçu sur les recommandations de mission de la revue à mi-parcours - octobre 2018 _____	49
Tableau 5 : Synthèse du niveau d'exécution des activités _____	49
Tableau 6 : Situation de l'exécution budgétaire par catégorie de dépenses _____	51
Tableau 7 : Situation de l'exécution budgétaire par composante _____	52
Tableau 8 : Situation de l'exécution budgétaire par nature de dépenses _____	52
Tableau 9 : Situation de l'exécution budgétaire par source de financement _____	53
Tableau 10 : Nombre de bénéficiaires occupants 23 ha de périmètres horticoles aménagés _____	53
Tableau 11 : Stockage et distribution de semences de riz améliorées _____	53
Tableau 12 : Le rendement de riz sur chaque site aménagé _____	54
Tableau 13 : Stockage et distribution de semences maraichers par site aménagé _____	54
Tableau 14 : Répartition des apprenants par niveau des centres d'alphabétisation _____	55
Tableau 15 : Membres de CGB par site rizicole aménagé _____	55
Tableau 16 : Nombre des Pistes réhabilitées _____	55
Tableau 17 : Nombre des éleveurs recensés par secteur de la ZIP _____	56
Tableau 18 : Nombre des paysans par site et les superficies mise en valeur _____	56

## **LISTE DES FIGURES**

Figure 1 : Exécution budgétaire par catégorie de dépenses _____	51
Figure 2 : Exécution budgétaire par composante _____	52
Figure 3 : Exécution budgétaire par nature de dépenses _____	52
Figure 4 : Exécution budgétaire par source de financement _____	53

## RÉSUMÉ

Le PADES est un projet financé par FIDA à hauteur de 13,4 millions de dollars US, soit 6.5 milliards de FCFA. Son objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les conditions pour le développement durable de l'économie rurale et le renforcement des capacités socio-économiques des communautés rurales de Tombali, Quínara et Bolama/Bijagós. Il est dans sa deuxième année. Le deuxième semestre du PTBA de l'exercice 2018 focalise sur les aménagements hydro-agricoles, l'aménagement des pistes rurales, recrutement des partenaires de mise en œuvre et l'ingénierie sociale autour des sites à réhabiliter, etc.

Les activités réalisées ainsi que les principaux résultats enregistrés au cours de ce deuxième semestre se déclinent par composantes comme suit :

### Réalisation physique par composante

De façon générale, le taux d'exécution technique des activités de toutes les composantes confondues s'élève à 80,82% par rapport au PTBA 2018. Par composante, les résultats du PTBA se déclinent comme suit :

**Composante A : Appui à la production et productivité rizicole et activités complémentaires.** Les activités programmées au titre de ce semestre s'articulent pour l'essentiel sur (i) les études techniques de mangrove type traditionnel et moderne ; (ii) les réhabilitations des mangroves type moderne ; (iii) les aménagements des périmètres maraichers ; (iv) l'appui aux producteurs en semences, kits et engrais maraichers ; (v) le renforcement institutionnel ; et (vi) la structuration des OPB.

Le taux d'exécution technique des activités de la composante A est de 80,72% par rapport au PTBA 2018.

#### Concernant les études techniques

***cinq (5) études techniques de mangrove type traditionnel sont achevées :*** (a) études techniques des mangroves de type traditionnel à Bedanda (800 ha), Caboxanque (1 800 ha), Cubumba (1 650 ha), Caur de Baixo (430 ha) et Quibil-Ilhéu de Infanda (1 650 ha); (b) les études systématiques des mangroves de type moderne à Gã Cumba-São Miguel (1 100 ha) (c) l'étude de faisabilité à Can ; (d) l'étude de réhabilitation de 13 ha de périmètres rizicoles et l'étude de réhabilitation du laboratoire et du magasin de stockage de semences de l'INPA à Contuboel ; et (e) les études techniques des bassins versants sur les 10 périmètres de rizières de mangrove.

#### Concernant les réhabilitations

***Six (6) rizières de 2 951 ha de mangrove de type traditionnel sont réhabilitées. Il s'agit de :*** (i) la rizière de Caboxanque (1 884 ha) avec 12 350 m de digue de ceinture; (ii) la rizière de Bedanda (351 ha) avec 6 240 m de digue de ceinture; (iii) la rizière de Cubumba (494 ha) avec 1 860 m de digue de ceinture; (iv) la rizière de Darsalame (44 ha) avec 915 m de digue de ceinture; (v) la rizière de Madina-Gantumane (32 ha) avec 3 125 m de digue de ceinture ; et (vi) la rizière de Mansane (126 ha) avec 16 849 m de digue de ceinture construits.

Le PADES a acquis 133 tuyaux PVC de diamètre 315 mm, 115 tuyaux PVC de diamètre 200 mm et 255 tuyaux PVC de diamètre 160 mm qui ont été distribués et placés dans chaque rizière.

**Trois (3) basfonds de 95 ha sont réhabilités.** Ce sont : (a) basfonds de Darsalame (42 ha) et basfonds de Madina-Gantumane (30 ha) dans le secteur d'Empada ; et (b) basfonds de Timbo 1 (23 ha) dans le secteur de Catió.

**Deux (2) rizières de 1 728 ha de mangrove de type moderne sont en cours de finalisation avec un taux d'exécution de 95%.** Il s'agit de : (i) la rizière de Gandua-Incomene (351 ha), l'entreprise CECO GB a achevé les travaux de construction des deux déchargeurs, l'un à cinq (5) tuyaux et l'autre à deux (2) tuyaux. Elle a fait la protection du bassin de dissipation avec des gabions, des couvercles placés et un dispositif de contrôle de l'eau dans les structures des déchargeurs et ; (ii) concernant la rizière Bissassema, les couvercles des tuyaux sont placés sur le châssis du déchargeur. L'entreprise CECO GB a également construit 400 m de barrage anti-sel, un déchargeur à trois (3) tuyaux et a réhabilité l'ancien déchargeur. Les tuyaux distribués ont été placés dans les digues de ceinture. Le taux d'exécution physique de cette activité pour le semestre est de 95% et pour le PTBA.

**Aménagement des périmètres maraîchers est achevé.** Deux (2) entreprises (HIDROLACS et HIDROGUINÉ) ont effectué la construction ou réhabilitation de quarante-six (46) puits dont dix-huit (18) dans le secteur de Bolama, dix-sept (17) dans le secteur de Tite, sept (7) dans le secteur de Bedanda et quatre (4) dans le secteur de Catió. Sur les périmètres maraîchers aménagés, l'UCP a recensé 952 bénéficiaires dont 951 femmes, 1 homme et 946 jeunes (tous sexes confondus). Le tableau 10 en annexe montre les puits construits dans chacune de localité et les nombres de bénéficiaires occupant ces 23 ha de périmètres horticoles aménagés. Voir le tableau 10 en annexe pour les détails.

#### Concernant la distribution des intrants

#### **L'approvisionnement de semences**

##### **✓ L'approvisionnement de semences améliorées de riz :**

Dans le cadre d'appui aux producteurs bénéficiaires à l'accès aux semences améliorées de riz, le PADES a distribué 51 820 kg de semences répartis comme suit : (i) régions Tombali dans les secteurs de Catió (13 860 kg) et Bedanda (24 250 kg) ; (ii) région Quinara dans les secteurs de Tite (7 960 kg) et Empada (5 750 kg). Au total 1 257 bénéficiaires de tous les sites aménagés dont 238 femmes, 1 019 hommes et 200 jeunes (tous sexes confondus) ont reçu des semences améliorées de riz. De façon générale, le rendement moyen des basfonds est de 1.64 t/ha n'a pas atteint le minimum 1,7 t/ha alors que celui des mangroves est passé de 1,6 t/ha à 1,93 t/ha. Par ailleurs, une amélioration de rendement de la production de riz est observée sur certains sites aménagés. Les tableaux 11 et 12 en annexe détaillent la distribution de semences de riz améliorées et le rendement moyen sur chaque site d'aménagement hydro-agricole.

Toutefois, quelques difficultés ont été constatées sur certains sites entre autres : (i) inondation du basfonds de Timbo 1 et des rizières de type traditionnel (Bedanda, Caboxanque...) à cause de la forte pluie ; et (ii) le manque de dessalement des rizières de type moderne de Gandua-Incomene et Bissassema-Nhala.

✓ ***L'approvisionnement de semences maraichères :***

Dans le cadre d'appui aux producteurs bénéficiaires à l'accès aux semences maraichères, le PADES a acquis 106 kg de semences maraichères des variétés suivantes : oignon (83 kg), tomate (2 kg) ; laitue (7 kg) ; poivron (2 kg) ; chou (2 kg), carotte (6 kg), aubergine (2 kg) et chou-fleur (2 kg). La distribution de ces semences maraichères a été réalisée de manière suivante : (i) région de Tombali 17,25 kg dont secteur de Bedanda (13,50 kg) et secteur de Catió (4,75 kg) ; (ii) région de Quinara 45,35 kg dont secteur de Tite (32,7 kg) et secteur d'Empada (12,65 kg) et ; (iii) région de Bolama 37 kg. Au total 952 bénéficiaires dont 951 femmes, 1 homme et 496 jeunes (tous sexe confondus) ont reçu des semences. Le tableau 13 en annexe donne les détails sur les données collectées. Toutefois, quelques difficultés ont été constatées sur les sites maraichers entre autre, le manque de l'eau dans les puits pour l'irrigation car ils ne sont pas profonds. Par ailleurs, pour assurer l'approvisionnement en semences et petits matériels maraichers pour la prochaine campagne, les bénéficiaires ont instauré une cotisation pour la création d'un fond. Le taux d'exécution physique pour le semestre et pour le PTBA est de 51%.

***L'approvisionnement en engrais :*** le PADES a acquis 19 tonnes d'engrais (NPK et Urée). Le stock d'engrais a été distribué aux bénéficiaires comme suit : (i) secteur de Catió, 8 100 kg ont été déposés, dont 4 719 kg ont été distribués à Timbo 1 (2 636 kg d'Urée et 2 083 kg de NPK) et ; (ii) secteur d'Empada, 9 900 kg ont été déposés dont 4 120 ont été distribués aux villages de Darsalame et Madina-Gantumane, soit 2 890 kg d'Urée et 1 230 kg de NPK ; (iii) et secteur de Bolama (1 000 kg). Au total 237 bénéficiaires dont 162 femmes et 42 jeunes (tout sexe confondu) ont reçu d'engrais.

***L'approvisionnement en vaccins :*** le PADES a acquis au cours de ce semestre 125 000 doses de vaccins pour l'élevage et les a livré à la Direction Générale d'Élevage pour les directions régionales de a zone d'intervention.

*Concernant le renforcement institutionnel, la sensibilisation et la formation des multiplicateurs de semence*

***En termes de renforcement institutionnel,*** le PADES a fourni à l'INPA deux (2) congélateurs armoires. Et l'installation des panneaux solaires de la chambre froide est en cours de réalisation. Et les activités ci-après ont été totalement réalisées : (a) la réhabilitation du laboratoire & du magasin de stockage est achevée et les ouvrages sont réceptionnés à l'INPA/Contuboel ; et (b) l'étude des périmètres rizicoles de Contuboel est achevée.

***La sensibilisation et la formation des agriculteurs multiplicateurs de semence :*** au cours de ce PTBA, l'INPA a formé 10 agriculteurs multiplicateurs de semences à Contuboel dont six (6) femmes, quatre (4) hommes et quatre (4) jeunes (hommes et femmes). Cette formation d'une durée de sept (7) jours est organisée autour des thèmes : (i) calendrier cultural et plan d'opération ; (ii) les opérations de préparation du sol ; (iii) semis direct ; (iv) opération de repiquage ; (v) gestion des opérations de récolte et de post-récolte ; (vi) préparation et semis de la pépinière ; et (vii) la protection des végétaux.

*Concernant la structuration des OPB*

Dans le cadre de la structuration des OPB, soixante-dix-neuf (79) missions de terrain programmées ont été réalisées. Ces missions ont permis de créer et d'animer douze (12) CGB (Comités de Gestion des Bolanhas), quarante-neuf (49) CDIT et cinq (5) CITEP. Elles ont



également permis de renforcer les capacités des OPB et d'appuyer les Comités de Gestion des Bolanhas et les CITEP à définir une cotisation et les modalités de collecte pour l'entretien des ouvrages (Bolanhas et pistes).

A cet effet, des animations ont été réalisées dans la zone d'intervention du projet autour des thèmes tels que (i) l'ingénierie sociale en lien avec l'évolution de l'ingénierie civile ; (ii) la disponibilité de l'eau dans les sites choisis pour les maraîchères ; (iii) le groupement de femmes maraîchères et la participation des jeunes dans le processus de mise en œuvre des activités du PADES et ; (iv) les rôles et attributions des CDIT, CGB et CITEP dans les villages. Au total 383 participants ont été enregistrés pour ces animations dont 238 hommes, 145 femmes, 95 jeunes (hommes et femmes).

### **Composante B : Appui à la valorisation des productions et accès au marché**

Au cours de cette année, les activités réalisées au titre de cette composante se concentrent autour : (i) de la réhabilitation des travaux d'arts de pistes et ; (ii) de l'acquisition et distribution d'équipements des CITEP.

Le taux d'exécution technique des activités de la composante B est de 83,90% par rapport au PTBA 2018. Ce taux est dû au fait que les travaux de réhabilitation des pistes de 32,3 km sont très avancés, vers l'achèvement.

#### Concernant la réhabilitation des pistes rurales

À titre de rappel, l'entreprise SOCOESTRADAS Lda a entamé les travaux de réhabilitation des quatre (4) tronçons : (i) Gandua-Tchugué (7,9 km) et Gandua-Incomene (6 km) dans le secteur de Catió ; (ii) Aidará-Can (4,9 km) dans le secteur d'Empada et ; (iii) Tite-Bissassema barrage (13,5 km) dans le secteur de Tite. Elle a effectué les travaux de l'art dans ces voies. Le taux d'exécution de ces travaux est estimé à 81,22%.

*NB : Concernant le tronçon L33-Caboxanque (11,7 km) qui doit être réalisé en 2019, l'UCP-PADES a lancé un appel d'offre international pour la sélection et la contractualisation d'une entreprise chargée de la réhabilitation de ce tronçon. Une commission créée à cet effet a sélectionné l'entreprise en cause. Le rapport d'appel d'offres a été envoyé au FIDA pour avis de non-objection*

#### Concernant l'équipement des CITEP avec des petits matériels

L'entreprise Global Services a été sélectionnée pour fournir les matériels ci-après mentionnés : 110 pelles, 110 brouettes, 110 pioches, 77 houes et 77 machettes. Ces matériels seront distribués aux CITEP de tronçons suivants : Aidará-Can, Gandua-Incomene, Gandua-Tchugué et Tite-Bissassema barrage. Le taux d'exécution physique de cette activité est de 50 pour le PTBA.

### **Composante C : Coordination et renforcement institutionnel**

Les activités de coordination et de suivi-évaluation des actions du PADES ont porté sur: (i) les travaux de rénovation du siège ; (ii) réalisation de l'étude géophysique et des travaux du forage; (iii) l'achat des mobiliers de bureaux et de chambre; (iv) installation de panneaux solaires; (v) réalisation de l'audit comptable et financier; (vi) création et animation des centres d'alphabétisation ; et (vii) amélioration et extension des CDIT ; (viii) enquête socio-

économique de référence ; et (ix) organisation des missions diverses du terrain de suivi-évaluation. Globalement le taux d'exécution des activités de cette composante est de 80,82% par rapport au PTBA 2018. Ces taux jugés satisfaisants s'expliquent, (a) d'une part, par le fait que la plupart des activités programmées au cours de cette année sont achevées, notamment, l'organisation et la réalisation des missions de la revue à mi-parcours, du comité de pilotage, l'élaboration & consolidation du PTBA 2019 au niveau central et le recrutement/l'appui des ATI pour l'appui à l'équipe de l'UCP et ; (b) d'autre part par le bon niveau d'exécution des activités en cours d'achèvement.

#### Concernant la coordination et gestion fiduciaire

Les principales activités exécutées au titre de cette sous-composante se présentent comme suit : (i) les travaux de rénovation du siège sont achevés ; (ii) l'étude géophysique est achevée et des travaux du forage sont aussi achevés avec un taux de réalisation de 100% ; (iii) les équipements des bureaux additionnels et des chambres sont acquis et installés ; (iv) l'audit comptable et financier est réalisé et le rapport final transmis au FIDA. Par ailleurs, l'élaboration/consolidation du PTBA 2019 et la mission de la revue à mi-parcours du projet ont été réalisées.

#### Concernant l'alphabétisation

(v) Les bénéficiaires ont construit un centre d'alphabétisation à Biassa dans le secteur d'Empada ; et (iv) l'animation s'est poursuivie dans tous les centres avec la participation de 395 apprenants dont 227 du niveau 1 et 168 du niveau 2. Sur 395 apprenants, on note 115 dans le secteur de Tite, 75 dans le secteur de Bolama, 46 dans le secteur d'Empada, 50 dans le secteur de Bedanda et 109 dans le secteur de Catió. Le tableau 14 en annexe renseigne sur le nombre d'alphabétisant et leur participation dans les cours.

#### Concernant l'amélioration et extension des CDIT

L'équipe technique du PADES, les ONG et les partenaires ont réalisé plus de 12 missions de terrain au cours de l'exercice du PTBA 2018. Ces missions ont permis : de redéfinir et d'adopter avec les bénéficiaires les principes de valeurs, les attributions ou responsabilités, la composition, les critères d'éligibilité des membres, les modèles de statuts et de règlement intérieurs des CDIT, CGB et CITEP. Par ailleurs une formation des OPB et surtout des femmes membres des CDIT, CGB, CITEP et CGP ont été organisée. Ces femmes ont été formées sur le thème : qualification des femmes dans les organes créés au sein du village. Parmi les participants, il y a vingt-six (26) femmes et trois (3) animateurs de l'ONG.

#### Concernant le suivi-évaluation

Au cours de cette année, l'enquête socio-économique de référence été réalisée et é achevée au mois de février 2018. Le rapport final est disponible. Toutefois, plusieurs missions à l'effet d'analyser le niveau d'avancement des travaux de réhabilitation des mangroves et de pistes ont été réalisées : ces missions ont permis de suivre et contrôler les résolutions prises lors du premier semestre concernant le retard accusé sur l'avancement des travaux de réhabilitation des deux (2) rizières de mangrove type moderne (Gandua-Incomene & Bissassema-Nhala).

Plusieurs enquêtes d'évaluation rapide ont été réalisées. Ces enquêtes ont permis d'évaluer la performance des partenaires et agents de PADES d'une part et d'autre part de mesurer l'effet

de l'alphabétisation sur les bénéficiaires. Il s'agit : (i) Évaluation rapide des ONG par les bénéficiaires ; (ii) Évaluation rapide des DRA (Directions Régionale de l'Agriculture) par les bénéficiaires ; (iii) Évaluation rapide des agents du PADES par les bénéficiaires ; (iv) Évaluation rapide de l'alphabétisation par les bénéficiaires ; (v) Évaluation rapide de l'INPA par les bénéficiaires. Par ailleurs, le recensement des éleveurs de la Zone d'Intervention du Projet (ZIP) ; les mesures de superficies exploitées par des agriculteurs des différentes rizières réhabilitées et le carré de rendement ont été réalisés.

Par ailleurs, le service suivi-évaluation a organisé plusieurs formations des partenaires techniques (DRA, CDIT et ONG) de mise en œuvre du Projet. Ces formations ont été dispensées sur les thèmes suivants : (a) utilisation de GPS pour la mesure des superficies exploités par les paysans ; (b) utilisation de la fiche de recensement des éleveurs ; (c) la mesure du carré de rendement ; (d) et l'utilisation des différentes fiches d'enquête (les évaluations rapides des ONG, de l'INPA, des agents de PADES et de l'alphabétisation). Au total, 86 bénéficiaires dont 21 femmes, 65 hommes et 72 jeunes (tout sexe confondu) ont participé aux différentes formations.

On note également qu'une mission de suivi ayant pour objectif d'évaluer le niveau de structuration et de fonctionnement des OPB a été réalisée. Au cours de cette mission, l'équipe a échangé avec : (i) quinze (15) CDIT dont neuf (9) dans le secteur d'Empada, quatre (4) dans le secteur de Catió et deux (2) dans le secteur de Bedanda ; (ii) sept (7) CGB dont deux (2) à Empada, trois (3) à Catió et deux (2) à Bedanda et ; (iii) trois (3) CITEP dont un (1) à Catió, un (1) à Empada et un (1) à Bedanda. Ces échanges ont porté sur : (i) le fonctionnement et l'organisation des OPB ; (ii) l'existence des textes fondateurs et la connaissance de leurs contenus par les organes et leurs membres.

L'analyse de ces échanges montre de façon générale : (a) qu'aucune des OPB visitées ne dispose de statuts, de règlement intérieur ni de programme de travail ; (b) 64% des OPB organisent des réunions des organes mais seulement 16% disposent de PV et de liste de présence y relatives et ; (c) 20% des OPB disposent des PV de constitution. La composition des organes diffère d'un secteur à un autre. Les recommandations ci-après ont été formulées :

- **Au Technicien chargé de l'ingénierie sociale** : (i) mettre en place un modèle de statuts, de règlement intérieur, de PV de constitution et de réunions des organes en vue d'uniformiser la structuration et le fonctionnement des OPB ; (ii) organiser le renforcement des capacités des membres des organes sur la gestion organisationnelle à l'effet d'accélérer l'autonomisation des OPB ;
- **Aux ONG partenaires de mise en œuvre** : (i) respecter le calendrier, la composition des organes et les critères de mise place des OPB prescrits par le PADES ; (ii) aider les OPB à établir leurs programmes de travail.
- **Au Service Suivi-évaluation de PADES** : organiser des missions de suivi régulières des OPB ;
- **Aux OPB** : organiser les réunions telles que indiquées dans les statuts et règlement intérieur et tenir à jour les documents y relatifs (PV de réunions, liste de présence, etc.).

Au total, 625 bénéficiaires dont 145 femmes et 358 jeunes (hommes et femmes) ont participé à ces rencontres.

### Réalisation financière

Pour l'analyse de l'exécution budgétaire par catégorie et par composante du PTBA, la réalisation annuelle s'élève à 2 839 352 728 F CFA d'une prévision annuelle de 2 915 742 886 F CFA, soit un taux de réalisation de 97,38%. Les tableaux d'exécution budgétaire représentés dans ce rapport font apparaître pour chaque catégorie de dépenses, les prévisions, les réalisations de ce semestre et les taux de réalisation.

### **Au niveau de la Passation de marchés :**

Sur les 54 marchés inscrits au PTBA 2018, 38 ont été réalisés. De façon désagrégée, le taux d'exécution selon les types de marchés est de 62% pour les marchés de biens (fournitures), 70% pour les services de consultance et 88% pour les travaux.

Concernant la passation de marché, le Coordonnateur et l'Assistant suivi-évaluation ont assuré le fonctionnement de passation de marché depuis le deuxième trimestre avant le recrutement effectif du Responsable de Passation de Marché qui a pris fonction en octobre 2018. Ceci a amélioré le processus dans la sélection des candidats et l'attribution des marchés objets de décaissement.

### Conclusion générale

Au cours de l'exercice du PTBA 2018, les réalisations financières du projet s'élèvent à 2 839 352 728 F CFA sur un montant total annuel de 2 915 742 886 F CFA, soit un taux global d'exécution financière annuel de 97,38% contre un taux de réalisation physique annuel estimé à 80,82%.

L'exercice 2018 s'est concentré sur les activités structurantes. Certaines réalisations structurantes prévues dans le cadre de l'exercice 2018 notamment, l'aménagement des trois (3) basfonds de 95 ha et de six (6) rizières de mangroves de type traditionnel de 2 951 ha ont été achevées.

La réhabilitation de 32,3 km de pistes et l'aménagement de 1 728 ha de mangroves de type moderne sont en cours avec un taux de réalisation respectivement de 81,22% et de 95%.

Au cours de cette année, les réalisations financières du projet s'élèvent à 2 839 352 728 F CFA soit un taux d'exécution financière estimé à 97,38% contre 80,82% de réalisation physique.

Par ailleurs, les ONG partenaires ont poursuivi avec les actions d'ingénierie sociale en vue de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires.

Au prochain PTBA, l'UCP/PADES a pris toutes les dispositions nécessaires afin mettre en exploitation les rizières réhabilitées et achevées.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PADES

Le tableau ci-dessous fait une présentation synthétique du Projet d'Appui au Développement Économique des Régions du Sud (PADES). Il faut souligner que le FIDA PBAS est un Fonds qui n'a pas été mis à disposition du PADES vu au retard accusé au démarrage du Projet.

**Tableau 1 : Résumé du PADES**

<b>Titre du Projet</b>	Projet d'Appui au Développement Économique des Régions du Sud ( <b>PADES</b> )			
<b>Référence</b>	1100001757			
<b>Ministère de tutelle</b>	Ministère de l'Agriculture et Développement Rural ( <b>MADR</b> )			
<b>Accords de financement</b>	<b>Prêt N° 2000000654, du 10 juin 2015</b> <b>Don N° 2000001113, du 10 juin 2015</b>			
<b>Date de signature et de mise en vigueur</b>	07 août 2015			
<b>Durée effective d'exécution</b>	6 ans			
<b>Date d'achèvement</b>	30 septembre 2021			
<b>Date de clôture</b>	31 mars 2022			
<b>Objectifs de développement du Projet</b>	<b>L'objectif global du PADES</b> est de contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les conditions pour le développement durable de l'économie rurale et le renforcement des capacités socio-économiques des communautés rurales de Tombali, Quínara et Bolama/Bijagós.			
	<b>L'objectif de développement du PADES</b> est relancer la production agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire et la diversification des revenus dans les régions de Tombali, Quínara et Bolama/Bijagós.			
<b>Groupe cible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>des riziculteurs et des producteurs maraîchers usagers des sites réhabilités (mangroves et bas-fonds) ainsi que les éleveurs bénéficiaires des activités complémentaires de promotion de l'élevage d'espèces à cycles courts ;</li> <li>les micro-entrepreneurs le long des filières ciblées ;</li> <li>les membres des organisations des producteurs de base (OPB) ;</li> <li>les bénéficiaires de la réhabilitation des infrastructures de transport.</li> <li>Le PADES touchera environ 31 277 bénéficiaires directs, dont 40% de femmes et 42% de jeunes, (hommes et femmes). Les femmes de moins de 35 ans constituent 42% de la frange jeune</li> </ul>			
<b>Principales composantes</b>	<b>Composante A :</b> Appui à la production et productivité rizicole et activités complémentaires			
	<b>Composante B :</b> Appui à la valorisation des productions et accès au marché			
	<b>Composante C :</b> Coordination et renforcement institutionnel			
<b>Régions d'intervention</b>	Les régions d'intervention sont : Tombali (Secteurs de Catió et Bedanda), Quínara (Secteurs de Empada et Tite) et Bolama Bijagós (Secteur de Bolama)			
<b>Coût total du Projet *</b>	<b>Source</b>	<b>Montant en millions d'USD</b>	<b>Montant en milliards de FCFA</b>	<b>Proportion</b>
	FIDA DON	4,7	2,3	25%
	FIDA PRÊT	4,7	2,3	25%
	<b>FIDA PBAS</b>	<b>5,5</b>	<b>2,7</b>	<b>29%</b>
	État	2,3	1,1	12%
	Bénéficiaires	1,7	0,8	9%
<b>Total</b>	<b>13,4</b>	<b>6,6</b>	<b>100%</b>	

## INTRODUCTION

Le Projet d'Appui au Développement des régions du Sud (PADES) a pour objectif global la réduction de la pauvreté dans les trois (03) Régions couvertes (Quínara, Tombali et Bolama/Bijagós) à travers l'augmentation et la valorisation de la production agricole, le renforcement des capacités socio-économiques des communautés rurales bénéficiaires et le développement des activités complémentaires génératrices de revenus.

L'objectif de développement de PADES est de relancer la production rizicole afin d'assurer la sécurité alimentaire et la diversification des revenus dans sa zone d'intervention. A cet effet, les effets attendus des activités et produits du projet sont : i) la production et la productivité du riz augmentent de façon significative ; ii) les producteurs améliorent leurs activités de diversification de revenu ; iii) les organisations professionnelles rurales rendent des services utiles à leurs membres ; et iv) la mobilité des personnes et la mise en marché des produits agricoles sont améliorées de manière durable.

Le Projet s'articule autour des trois (03) composantes ci-après : i) Appui à la production et productivité rizicole et activités complémentaires (réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles ; exploitation des sites et développement des activités complémentaires) ; ii) Appui à la valorisation des productions et accès au marché (promotion des métiers connexes et de la valorisation post-récolte ; construction et réhabilitation des pistes rurales) ; iii) Coordination et renforcement institutionnel (coordination et suivi-évaluation ; mise à l'échelle des CDIT).

Le groupe cible du projet est constitué par la population pauvre des communautés villageoises concernées et organisées dans le cadre d'associations et de groupements de producteurs et d'intérêt économique, il s'agit des : (i) agriculteurs riziculteurs de mangroves et de basfonds, qui constituent la majorité de la population des villages retenus par le PADES ; (ii) les femmes rurales dont les femmes chefs de ménage sans ressource ; iv) et les jeunes pour la plupart sans emplois ; ils constituent une cible particulière de par leur situation précaire.

La zone du Projet est constituée par les trois (03) régions : Quinara, Tombali et Bolama/Bijagós. Au total le PADES couvrira donc d'une manière directe cinq (05) secteurs comprenant cinquante (50) villages et ciblera environ 31 277 personnes dont 40% de femmes et 42% de jeunes de tous sexes confondus. Il touchera au total 105 480 personnes.

La durée prévue du PADES est de 06 ans. Le coût total du Projet est 9 310 M F CFA, TTC, le Projet est cofinancé par le FIDA (7 350 M F CFA), l'État de la Guinée-Bissau (1 127 M F CFA) en taxes et droits de douane et les bénéficiaires (833 M F CFA).

Prévu sur 6 ans, la date d'achèvement des activités du Projet est fixée au 30 septembre 2021 et la date de clôture du prêt FIDA est fixée au 31 mars 2022.

Le présent rapport semestriel rend compte des activités qui se sont déroulées du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2018. Pour ce faire, il est organisé en deux parties.

**1<sup>ÈRE</sup> PARTIE : EXÉCUTION PHYSIQUE DES ACTIVITÉS :** présente l'état d'avancement et l'achèvement global des activités, les segmente par composante et sous-composante. Elle apprécie en outre le niveau d'exécution des principales recommandations de mission de la Revue à Mi-Parcours (RMP) au cours de l'exercice 2018.

**2<sup>ÈME</sup> PARTIE : EXÉCUTION FINANCIÈRE** fait le point de la gestion administrative et comptable du projet, analyse les taux d'exécution financière par nature de dépenses, par composante, par catégorie de dépense et par source de financement. Elle présente en outre le plan de passation et d'exécution des marchés par composante et par type.

En guise de conclusion, le rapport présente une analyse critique des difficultés et contraintes rencontrées au cours de ce semestre et propose des perspectives d'amélioration pour l'année à venir.

**1<sup>ERE</sup> PARTIE**

**EXÉCUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES  
JANVIER - DÉCEMBRE 2018**

Cette première partie du rapport, outre la présentation du niveau d'exécution des activités programmées pour l'exercice du PTBA 2018, donne un aperçu succinct des activités menées au cours de cette année et également l'état de mise en œuvre des recommandations de mission de la Revue à Mi-Parcours (RMP) réalisée au mois d'octobre 2018.

## **I. APERÇU SUR LES RECOMMANDATIONS DE MISSION DE LA RMP**

La mission de la Revue à Mi-Parcours (RMP) du octobre 2018, a remis à l'UCP-PADES les recommandations de 40 activités prévues dont 13 ont été réalisées, 20 en cours et 7 ne sont pas encore entamées, comme l'indique le tableau 4 en annexe.

## **II. SITUATION DE L'EXÉCUTION DES ACTIVITÉS**

Les activités programmées dans le PTBA 2018 sont exécutées au titre de l'exercice du PTBA 2018 sous analyse concernant les trois composantes du projet ci-après sommairement décrites :

### **2.1 Composante A : Appui à la production et productivité rizicole et activités complémentaires**

La composante A «Appui à la production et productivité rizicole et activités complémentaires» a pour objectif principal la promotion du trinôme riz/maraichage/petit élevage ciblant les ménages les plus vulnérables afin de leur permettre d'avoir accès à une combinaison d'appuis susceptibles de les sortir durablement de la précarité.

La Composante A est organisée en deux sous-composantes, à savoir : La sous-composante A1 financera la réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles et la sous-composante A2 financera l'exploitation des sites réhabilités et le développement des activités d'élevage et de maraichage.

#### **2.1.1 Sous-composante A1 : Réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles**

L'effet attendu de la sous-composante A1 sera : la production et la productivité du riz augmente de manière significative. Pour cela, le projet prévoit de réhabiliter : (i) 1 500 ha d'aménagements de mangroves de type moderne dans la région de Quinara ; (ii) 6 950 ha d'aménagements de mangroves de type traditionnel dans la région de Tombali ; (iii) 50 ha de bas-fonds dans la région de Quinara et ; (iv) 30 ha de bas-fonds en culture de contre-saison à Quinara, Tombali et Bolama.

##### **2.1.1.1 Volet A1 : Réhabilitation des aménagements en zones de mangrove et basfonds**

Objectifs d'année 2018 :

- Réhabiliter 4 250 ha de mangrove type traditionnel à Cubumba, Caboxanque et Bedanda ;
- Aménager 50 ha de bas-fonds à Daresalame et Madina-Gantumane ;
- Aménager 5 ha de périmètres maraîchers (sites déjà sélectionnés) ;



- Réhabiliter 1 727 ha de mangrove de type moderne à Nhala et Gandua ;
- Conduire étude technique dans les rizières de Cubumba, Bedanda, Caboxanque, Gã-Cumba-São Miguel, Caur de Baixo et Quibil-Ilhéu de Infanda. Réhabiliter 4 250 ha de mangrove type traditionnel à Cubumba, Caboxanque et Bedanda.

Les activités suivantes ont été réalisées :

#### **A110102 Contractualiser les ONG prestataires des services**

La mise en œuvre de cette activité a été anticipée par la présentation du bilan de la prestation des ONG au cours de l'année 2017. L'appréciation de la performance de chaque ONG est faite sur la base des critères définis dans le tableau ci-après. Il ressort que toutes les cinq ONG, à savoir : ANCOFF-GB secteur d'Empada et NADEL secteur de Tite dans la région de Quinara, APRODEL secteur de Bolama, région de Bolama-Bijagós, NIMBA secteur de Catió et COCEDECAS & DDS-IE-GB secteur de Bedanda dans la région de Tombali, ont atteint une notation supérieure à la note minimale requise (70 points).

Les ONG ont effectué les animations, sensibilisations, mobilisations et le renforcement des capacités des bénéficiaires et de leurs organisations autour d'ingénierie sociale sur les activités structurantes. Ci-après la synthèse des notes obtenues par les ONG selon les critères établies.

Critères	ONG				
	NIMBA	NADEL	COCEDECAS & DDS-IEGB	ANCOFF-GB	APRODEL
Performance par rapport aux prévisions physiques de l'année (sur 40 points)	37	38	34	35,5	32,25
Performance par rapport à la stratégie de mise en œuvre adoptée sur le terrain (sur 15 points)	13,25	13	11	12,25	08
Appréciation de la qualité et de la régularité dans la transmission des rapports (sur 15 points)	12	13	10,75	12,5	08,75
Appréciation de la gestion financière (sur 30 points)	25	27	24,5	27,5	24,5
<b>Note sur 100</b>	<b>87,25</b>	<b>91</b>	<b>80,25</b>	<b>87,75</b>	<b>73,5</b>

Suite à cette appréciation, les conventions ont été renouvelées et de contrats de prestations signés pour une durée d'un an. Le taux d'exécution de l'activité pour PTBA est de 100%.

#### **A110103 Signer les conventions avec les services techniques d'état**

Concernant cette activité, il était prévu au cours de cette année de signer trois conventions avec les Directions Techniques ci-après : (i) Direction Générale d'Ingénierie & Développement Rural (DGIDR) ; (ii) la Direction Générale de Forêt & Faune (DGFF) et ; (iii) la Direction Générale des Ressources Hydriques (DGRH). À cet effet le PADES a signé trois (3) conventions avec DGIDR, DGRH et DGFF au cours de ce PTBA 2018. Cette activité est achevée.

#### **A110202 Conduire des séances d'information/concertation avec des OP pour démarche APP**

Il s'agit de conduire dans les villages, des séances d'information et de concertation relatives à la démarche APP en vue d'élaborer de manière participative des plans d'aménagement hydro-

agricoles. À cet effet, l'Expert en Génie Rurale du PADES ensemble avec les ONG et le point focal de la DGIDR ont réalisés une séance de travail avec les bénéficiaires des rizières de Caboxanque, Bedanda, Cubumba, Caur de Baixo, Gã Cumba-São Miguel et Quibil-Ilhéu de Infanda pour analyser les problèmes de ces rizières et proposer des solutions. Les problèmes évoqués par les bénéficiaires ont été transmis au consultant pour qu'il puisse les prendre en compte. Un total de 483 agriculteurs dont 21% femmes et 79% hommes ont participé aux réunions. Le taux d'exécution pour le PTBA est estimé à 75%.

**A110301 Conduire les études techniques des mangroves type traditionnel à Bedanda, Caboxanque, Cubumba, Caur de Baixo et Quibil-Ilhéu d'Infanda**

Les études techniques des mangroves de type traditionnel sont achevées sur les cinq (5) rizières, notamment celles de Bedanda (800 ha), Caboxanque (1800 ha), Cubumba (1 650 ha), Caur de Baixo (430 ha) et Quibil-Ilhéu de Infanda (1 650 ha). Le rapport final d'étude est disponible et le taux d'exécution est de 100% pour le PTBA.

**A110302 Conduire les études systématiques des mangroves type moderne à Gã Cumba-São Miguel**

La réalisation des études des mangroves de type moderne à Gã Cumba-São Miguel est achevée. Un atelier de restitution d'étude a été organisé avec la participation de de vingt-quatre (24) participants dont vingt (22) hommes et deux (2) femmes. Les contributions des participants et commentaires de l'expert en génie rurale ont été pris en compte pour améliorer le rapport. Le rapport final est disponible. Le taux d'exécution de cette activité est de 100% pour le PTBA 2018.

**A110304 Conduire étude APD à Can**

Huit (8) bureaux d'étude ont manifesté leur intérêt pour la réalisation de l'étude APD de la rizière du Can Balanta. Une commission a été créée par une demande d'arrêt du Ministre de l'Agriculture. Cette commission a sélectionné six bureaux d'étude qui ont constitué la liste restreinte pour présenter leur proposition technique et financière. Cette liste a été envoyée au FIDA pour la demande de non objection.

Le taux d'exécution physique de cette activité est de 20% pour le PTBA.

**A110401 Mettre en place et former des CGB**

Cette activité a été réalisée à travers la mise en place effective de douze (12) Comités de Gestion des rizières dont deux (2) dans les secteurs de Bedanda (Caboxanque, Bedanda), cinq (5) de Catió (Cubumba de Mato, Timbo 1, Mansane, Gandua Incomene et Quibil-Ilheu de Infanda), trois (3) d'Empada (Darsalame, Madina-Gantumane et Can) et deux (2) à Tite (Flora et Bissassema-Nhala). Le taux d'exécution de l'activité est estimé à 100% pour le PTBA. Le tableau 15 en annexe montre le nombre des membres du CGB par rizière et par secteur dont la représentativité des femmes varie entre 28 à 46% des membres élus.

**A110402 Réhabiliter les mangroves de type traditionnel**

La réhabilitation 2 951 ha de mangrove de type traditionnel se déroule dans six (6) rizières (Bolanhas) : (i) rizière de Caboxanque (1 884 ha), rizière de Darsalame (42 ha), rizière de Madina-Gantumane (32 ha) et rizière de Bedanda (371 ha)<sup>1</sup> dans le secteur de Bedanda ; (ii) rizière de Cubumba (494 ha) dans le secteur de Catió ; et (iii) rizière de Mansane (126 ha).

La réhabilitation des rizières de Caboxanque, Bedanda, Darsalame, Madina-Gantumane et Cubumba est achevée au premier semestre.

La réhabilitation de 126 ha de mangrove de type traditionnel à Mansane, qu'auparavant était suspendue, a été reprise et achevée. L'entreprise ACAT contractualisée a appuyé les agriculteurs dans la réhabilitation ou construction des 16 849 m de digues, soit 4 758 m de digues de rétention de l'eau et 12 091 m de digues anti érosion. Elle a également placé les 16 tuyaux PVC de 315 mm dans les digues de rétention.

Par ailleurs, le plan de réhabilitation/construction des digues de la rizière de Mansane a été modifié. Ces changements sont dus à la modification du chemin l'eau du fleuve par les travaux de réhabilitation de la route reliant Buba et Catió. Vu de ces modifications mentionnées ci-dessus, l'UCP-PADES en accord avec le consultant qui a mené l'étude et les bénéficiaires, a autorisé la construction des digues le long du fleuve et l'installation des tuyaux PVC en lieu et place des régulateurs. Le taux d'exécution physique est de 100 % pour le PTBA.

N°	Rizière	Surface réhabilitée (ha)	Longueur de digue de ceinture (m)	Tuyaux		
				PVC 315 (mm)	PVC 200 (mm)	PVC 160 (mm)
01	Caboxanque	1884	12 350	81	88	155
02	Bedanda	371	6 240	18	12	30
03	Cubumba	494	1 860	21	15	45
04	Darsalame	44	915	5	0	10
05	Madina-Gantumane	32	3 125	8	0	15
06	Mansane	126	16 849	16	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2 951</b>	<b>41 339</b>	<b>149</b>	<b>115</b>	<b>255</b>

**A110403 Réhabiliter les mangroves type moderne**

La réhabilitation 1 728 ha de mangrove de type moderne se déroule dans deux (2) rizières (Bolanhas) : (i) rizière de Gandua-Incomene (351 ha) dans le secteur de Catió ; et (ii) rizière de Bissassema-Nhala (1 377 ha) dans le secteur de Tite.

À Gandua-Incomene, l'entreprise CECO GB a achevé les travaux de construction des deux déchargeurs, l'un à cinq (5) tuyaux et l'autre à deux (2) tuyaux. Elle a fait la protection du bassin de dissipation avec des gabions, des couvercles placés et un dispositif de contrôle de l'eau dans les structures des déchargeurs.

À Nhala, les couvercles des tuyaux sont placés sur le châssis du déchargeur. L'entreprise CECO GB a également construit 400 m de barrage anti-sel, un déchargeur à trois (3) tuyaux et

<sup>1</sup> Auparavant la valeur était 351 ha et après la vérification de données il est constaté que la valeur réelle est de 371 ha.

a réhabilité l'ancien déchargeur. Les tuyaux distribués ont été placés dans les digues de ceinture.

Le taux d'exécution physique de cette activité est de 95% pour le PTBA.

#### **A110404 Réhabiliter les bas-fonds**

Les travaux de réhabilitation se déroulent dans trois(3) bas-fonds : (i) bas-fonds de Daresalame (42 ha) et bas-fonds de Madina-Gantumane (30 ha) dans le secteur d'Empada ; et (ii) bas-fonds de Timbo 1 (23 ha) dans le secteur de Catió.

Les agriculteurs eux même ont réhabilité 915 m et 3 125 m de digue de ceinture a Daresalame et Madina-Gantumane respectivement. L'entreprise ACAT a construit un régulateur à Daresalame et 268 m de digue anti sel à Madina-Gantumane. Les travaux de réhabilitation sont achevés dans ses trois (3) basfonds et la surface totale réhabilité est 95 ha sur 27 ha prévus.

#### **A110405 Aménager les périmètres maraîchers**

Cette activité vise à aménager les périmètres maraîchers dans la zone d'intervention du projet. A cet effet une mission conjointe avec la Direction Générale des Ressources Hydriques (DGRH) a été réalisée. Cette mission a permis d'identifier des sites où seront construits ou réhabilités quarante-six (46) puits.

Le PADES a signé deux contrats avec les entreprises (HIDROLACS et HIDROGUINÉ) pour la construction ou réhabilitation des quarante-six (46) puits. Les travaux sont divisés en trois lots : (i) le lot 1, secteur de Bolama (HIDROGUINÉ) et ; (ii) les lots 2 et 3, secteurs de Catió, Bedanda, Empada et Tite concerne à l'entreprise HIDROLACS.

Les travaux de construction/réhabilitation de 46 puits (39 construits et 7 réhabilités) ont été réalisés conformément aux exigences techniques prescrites dans le TdR, notamment, (i) la qualité des travaux (revêtement interne, respect du ratio sable / ciment / gravier) ; (ii) le nombre en quantité et qualité acceptables des matériaux/équipements essentiels pour le travail. Sur les périmètres maraîchers aménagés, l'UCP a recensé 952 bénéficiaires dont 951 femmes et 496 jeunes (tous sexes confondus). Le tableau 10 en annexe montre les puits construits dans chacune de localité et les nombres de bénéficiaires occupant ces 23 ha de périmètres horticoles aménagés. Le niveau d'exécution des travaux est de 100% pour le PTBA.

#### **A110501 Conduire les études techniques des bassins versants sur les 10 périmètres de rizière de mangrove**

Les études des bassins versants sont conclues et achevées. Une restitution a été organisée avec la participation de quarante-six (46) agriculteurs, dont huit (8) femmes et trente-six (36) hommes. Quatre (4) représentants des ONG partenaires ont aussi participé à cette restitution. Les recommandations des participants ont été prises en compte dans le rapport final.

#### **A110406 Assurer la supervision des travaux par IGR et ATN**

L'IGR et l'ATN ont effectué des visites de supervision dans les aménagements de Caboxanque, Bedanda, Cubumba, Darsalame, Madina-Gantumane, Gandua et Bissassema-Nhala ainsi que les pistes rurales (tronçons de Aidará-Can, Gandua-Incomene, Gandua-Tchugué et Tite-Bissassema barrage). Les constats et observations sont satisfaisants, malgré les retards énormes vérifiés, en particulier dans les travaux de la rizière de Bissassema-Nhala par

l'entreprise CECO GB. Ces travaux sont menés conformément aux exigences techniques de l'étude. Le taux de réalisation est 133% pour le PTBA.

### **2.1.2 Sous-composante A2 : Exploitation des sites et développement des activités complémentaires**

L'objectif est de renforcer les capacités techniques et institutionnelles des partenaires et prestataires de services.

Les résultats escomptés pour la période sont entre autres :

1. Renforcement institutionnel de l'INPA (réhabilitations du laboratoire de semences, réhabilitation du magasin de stockage de semences, réhabilitation des périmètres rizicoles et installation d'une chambre froide solaire tous à Contuboel ;
2. Renforcement des capacités des partenaires de la mise en œuvre du projet ;
3. Formation des multiplicateurs de semences ; et
4. Production de 37,5 t de semences de riz de base de qualité.

Pour atteindre les objectifs visés, les activités programmées et réalisées dans ce semestre 2018, sont les suivantes :

#### **A210101 Établir convention avec l'INPA**

Une convention trisannuelle a été signée en 2017. Pour l'année 2018, une programmation des activités à mettre en œuvre par l'INPA et en conformité avec le PTBA a été élaborée et signée au cours de cette année. Les principales activités concernent surtout : la sensibilisation des producteurs de semences de riz, la formation des agriculteurs multiplicateurs, la production de semences de riz de base, la supervision, la sélection et l'achat de semences de riz auprès des agriculteurs. Le taux d'exécution est de 100% pour le PTBA.

#### **A210102 Accompagner la production de semences de riz de base**

Cette activité vise à accompagner l'INPA à produire la semence de riz de base. À cet effet l'INPA a semé 4 ha de contre saison à Contuboel pour la production de semences de riz de basfonds. La quantité de semences récoltée est de 13 t. Le taux d'exécution est de 35% pour le PTBA.

#### **A210106 Sensibiliser les agriculteurs multiplicateurs de semences**

Cette activité vise à sensibiliser les agriculteurs multiplicateurs de semences afin de garantir la production, la qualité et la disponibilité de semence, l'organisation des multiplicateurs de semence et d'assurer le système de production de riz.

Au cours de ce PTBA, l'INPA a organisé la sensibilisation des agriculteurs multiplicateurs de semences autour du thème : Production du riz et autres aspects de développement rural, diversification des cultures, activités extra-agricoles d'alimentation et de nutrition. Au total 183 agriculteurs ont été sensibilisés dont 90 femmes et 88 jeunes (hommes et femmes). Cette sensibilisation s'est déroulée dans cinq (5) villages du secteur de Bedanda (Guiledje, Catchamba-susso, Iemberém, Cafal, Caboxanque et Cadique Nalu) et dans un (1) village du

secteur de Cacine (Gadamael Porto) dans la région de Tombali. Le taux d'exécution est de 100% pour le PTBA.

#### **A210107 Former les agriculteurs sur les techniques de production de semences de riz**

Cette activité consiste à former les agriculteurs sur les techniques de production de semences de riz. Au cours de cette année, l'INPA a organisé une séance de formation de dix (10) agriculteurs multiplicateurs de semences à Contuboel dont six (6) femmes, quatre (4) hommes et quatre (4) jeunes (hommes et femmes). Cette formation d'une durée de sept (7) jours est organisée autour des thèmes : (i) calendrier cultural et plan d'opération ; (ii) les opérations de préparation du sol ; (iii) semis direct ; (iv) opération de repiquage ; (v) gestion des opérations de récolte et de post-récolte ; (vi) préparation et semis de la pépinière ; et (vii) la protection des végétaux. Le taux d'exécution est autour de 50% pour le PTBA.

#### **A210301 Appuyer l'accès des producteurs bénéficiaires aux semences certifiées de riz**

Dans le cadre d'appui aux producteurs bénéficiaires à l'accès aux semences améliorées de riz, le PADES a distribué 51 820 kg de semences répartis comme suit : (i) région de Tombali dans les secteurs de Catió (13 860 kg) et Bedanda (24 250 kg) ; (ii) région Quinara dans les secteurs de Tite (7 960 kg) et Empada (5 750 kg).

Au total 1 257 bénéficiaires de tous les sites aménagés dont 238 femmes, 1 019 hommes et 200 jeunes (tous sexes confondus) ont reçu des semences améliorées de riz. De façon générale, le rendement moyen des basfonds est de 1.64 t/ha n'a pas atteint le minimum 1.7 t/ha alors que celui des mangroves est passé de 1,6 t/ha à 1,93 t/ha. Par ailleurs, une amélioration de rendement de la production de riz est observée sur certains sites aménagés. Le tableau 11 et 12 en annexe détaille la distribution de semences de riz améliorées et le carré de rendement sur chaque site d'aménagement hydro-agricole.

Toutefois, quelques difficultés ont été constatées sur certains sites entre autres : (i) inondation du bas-fond de Timbo 1 et des rizières de type traditionnel (Bedanda, Caboxanque...) à cause de la forte pluie ; et (ii) le manque de dessalement des rizières de type moderne de Gandua-Incomene et Bissassema-Nhala. Le taux d'exécution physique est de 56% et pour le PTBA.

#### **A210302 Appuyer l'accès des producteurs bénéficiaires aux semences d'espèces maraichères**

Dans le cadre d'appui aux producteurs bénéficiaires à l'accès aux semences maraichères, le PADES a acquis 106 kg de semences maraichères des variétés suivantes : oignon (83 kg), tomate (2 kg) ; laitue (7 kg) ; poivron (2 kg) ; chou (2 kg), carotte (6 kg), aubergine (2 kg) et chou-fleur (2 kg).

La distribution de ces semences maraichères a été réalisée de manière suivante : (i) région de Tombali 17,25 kg dont secteur de Bedanda (13,50 kg) et secteur de Catió (4,75 kg) ; (ii) région de Quinara 45,35 kg dont secteur de Tite (32,7 kg) et secteur d'Empada (12,65 kg) et ; (iii) région de Bolama 37 kg. Au total 952 bénéficiaires dont 951 femmes, 1 homme et 496 jeunes (tous sexe confondus) ont reçu des semences. Le tableau 13 en annexe donne les détails sur les données collectées.

Toutefois, quelques difficultés ont été constatées sur les sites maraîchers entre autre, le manque de l'eau dans les puits pour l'irrigation car ils ne sont pas profonds. Par ailleurs, pour assurer l'approvisionnement en semences et petits matériels maraîchers pour la prochaine campagne, les bénéficiaires ont instauré une cotisation pour la création d'un fond. Le taux d'exécution physique pour le PTBA est de 51%.

#### **A210303 Appuyer l'accès des producteurs bénéficiaires aux engrais**

Dans le cadre d'appui aux producteurs bénéficiaires à l'accès aux engrais dans les basfonds, le PADES a acquis 19 tonnes d'engrais (NPK et Urée). Le stock d'engrais a été distribué aux bénéficiaires comme suit : (i) secteur de Catió, 8 100 kg ont été déposés, dont 4 719 kg ont été distribués à Timbo 1 (2 636 kg d'Urée et 2 083 kg de NPK) et ; (ii) secteur d'Empada, 9 900 kg ont été déposés dont 4 120 ont été distribués aux villages de Darsalame et Madina-Gantumane, soit 2 890 kg d'Urée et 1 230 kg de NPK ; (iii) et secteur de Bolama (1 000 kg) . La distribution d'engrais stocké par sites a été réalisée par les bénéficiaires producteurs du riz de basfonds en respectant la proportion par rapport à la surface de chaque producteur du riz.

Au total 237 bénéficiaires dont 162 femmes et 42 jeunes (tout sexe confondu) ont reçu des semences. Mais la plupart des bénéficiaires n'ayant pas l'habitude d'utiliser les engrais ne l'ont pas utilisé. À cet effet, UCP-PADES prévoit organiser une campagne de sensibilisation pour la prochaine campagne. Le taux d'exécution physique pour le PTBA est de 100%.

#### **A210306 Appuyer l'accès des producteurs bénéficiaires au kit maraîcher**

Il s'agit d'appuyer les femmes maraîchères avec les petits matériels pour faciliter leur travail dans les périmètres maraîchers. Le PADES a acquis seulement 341 arrosoirs. L'augmentation de périmètre maraîchers de 10 ha à 23 ha n'a pas permis d'acquérir des autres petits matériels (kits) comme il été prévu. Seulement les arrosoirs acquis ont été distribués de manière suivante : secteur de Bedanda 40 unités ; secteur de Catió 20 unités ; secteur de Tite 83 unités ; secteur d'Empada 41 unités et ; secteur de Bolama 116 unités. Voir le tableau 13 sur la distribution de semences maraîchères. Le taux d'exécution physique pour le PTBA est de 114%.

#### **A210406 Organiser des visites d'échanges entre les producteurs à l'échelle nationale**

Une visite d'échange a été réalisée au profit des Organisations de Producteurs à la Base (OPB) de la zone d'intervention du projet en vue de les amener à s'inspirer des exemples de réussite pour améliorer leurs performances. 16 producteurs, dont 09 femmes se sont déplacés à Bafatá pour visiter le périmètre rizicole irrigué du fleuve de Campossa (110 ha) et d'y échanger les expériences mutuelles avec les membres de l'Association Campossa de 453 membres dont 50 hommes. Cette activité est achevée entièrement et le taux d'exécution est de 100% sur le PTBA.

#### **A210408 Organiser un programme de formation de mise à niveau du personnel technique (ONG, DRA, etc.)**

Concernant cette activité, le projet a organisé trois sessions de formations au profit de personnel technique (ONG, DRA, etc.) pour renforcer leur capacité par rapport à des

thématiques précises en lien avec leurs activités d'encadrement des bénéficiaires. Les formations sont déroulées dans le secteur de Buba (région de Quinara) ; le secteur de Catió (région de Tombali) et le secteur de Bolama (région de Bolama/Bijagós). Les personnels techniques des Directions Régionales et les animateurs des ONG ont été formés sur les thèmes suivants : (i) la production rizicole dans les mangroves, et basfonds ; (ii) la production maraîchère ;(iii) protection phytosanitaires et alignement des planches et (iv) la mesure du carré de rendement. La formation a été divisée en deux parties, la théorie et la pratique. Ils sont au nombre de 50 participants dont 25 animateurs des ONG et 25 techniciens des DRA. Le taux d'exécution est de 100% pour le PTBA.

#### **2.1.2.1 Volet A22 : Appui à l'élevage à cycles courts et maraîchage**

L'objectif est de fournir 125 000 doses de vaccins pour l'élevage. Le PADES aidera la Direction Générale d'Élevage pour réaliser la protection sanitaire des animaux de la zone d'intervention du projet afin de réduire les pertes liées aux maladies animales.

##### **A220104 Appuyer l'approvisionnement en vaccins**

Cette activité vise à soutenir la Direction Générale d'Élevage pour la protection sanitaire des animaux de la zone d'intervention du projet afin de réduire les pertes liées aux maladies animales.

Au cours de ce PTBA, le PADES a acquis 125 000 doses de vaccins pour l'élevage et les a livré à la Direction Générale d'Élevage pour les trois services vétérinaires régionaux de la ZIP. Les produits fournis sont : 9 000 doses de vaccins PPR, 4 500 doses de Pasteurilad, 6 000 doses de ita-new, 2 400 de vaccin carbovin, 3 000 doses de carbosympto, 10 000 ml de oxycline (antibiotique), 10 000 ml anti-stress vitam/oligovit, 3 000 comprimés de déparasitant trisol, 3 000 comprimés de déparasitant bolumisole, 30 flacons de vetospray. Cette activité est achevée.

#### **2.1.2.2 Volet A23 : Appui à la structuration des OP et à la plateforme nationale**

L'objectif est de renforcer les capacités à la structuration des OP et des Plateforme nationale. Le PADES travaillera à l'émergence de l'organisations de bases fortes, dont les membres sont informés et participent à la vie de leur organisation en s'acquittant de leurs cotisations, en participant aux réunions. Les membres des OPB devront être informés sur la gestion des fonds et exiger l'accès à l'information.

Les activités programmées sont suivantes :

##### **A230101 Former les leaders des OPB**

Cette activité permet de renforcer la capacité les leaders des OPB. Au cours de cette année, les membres des bureaux des OPB (CGB, CITEP et CGP) ont été formés à la connaissance de leurs rôles, des textes réglementaires, des droits et devoirs des membres. Alors plus de 50% des membres des CGB, CITEP et CDIT connaissent leurs rôles et attributions. .

Le taux d'exécution physique est de 75% pour le PTBA.



#### **A230102 Éditer le Mémento du leader**

Un mémento en 500 exemplaires est édité, sur la Gestion Organisationnelle et le leadership. Ce livre où sont résumées toutes les parties essentielles du leadership et de la gestion organisationnelle est mis à la disposition à tous les membres des CDIT de 49 villages du PADES. Il constitue un excellent moyen de diffusion des connaissances dans les OPB. Il permet aussi de ne pas toujours reprendre la formation des membres des nouveaux bureaux. Cela permet enfin à ceux qui veulent accéder aux responsabilités de se former pour oser postuler aux postes de gouvernance. Le taux d'exécution physique du PTBA est de 100%.

#### **A230104 Accompagner l'appui à la structuration des OPB**

Dans la logique d'assurer la durabilité des activités des infrastructures de bolanha et des périmètres maraîchers aménagés, il est nécessaires de consolider les différentes structures créées aux bénéfices des petits producteurs.

Dans le cadre de la structuration des OPB, soixante-dix-neuf (79) missions de terrain programmées ont été réalisées. Ces missions ont permis de créer et d'animer douze (12) CGB (Comités de Gestion des Bolanhas), quarante-neuf (49) CDIT et cinq (5) CITEP. Elles ont également permis de renforcer les capacités des OPB et d'appuyer les Comités de Gestion des Bolanhas et les CITEP à définir une cotisation et les modalités de collecte pour l'entretien des ouvrages (Bolanhas et pistes).

A cet effet, des animations ont été réalisées dans la zone d'intervention du projet autour des thèmes tels que (i) l'ingénierie sociale en lien avec l'évolution de l'ingénierie civile ; (ii) la disponibilité de l'eau dans les sites choisis pour les maraîchères ; (iii) le groupement de femmes maraîchères et la participation des jeunes dans le processus de mis en œuvre des activités du PADES et ; (iv) les rôles et attributions des CDIT, CGB et CITEP dans les villages. Au total 383 participants ont été enregistrés pour ces animations dont 238 hommes, 145 femmes, 95 jeunes (homme et femmes). Le taux d'exécution physique est 133% pour le PTBA.

#### **A230201 Former aux fonctions organisationnelles et appuyer la tenue des instances**

Les rôles et fonctions suivant les échelles d'organisation ne sont pas clairement compris. Le PADES appuiera la Plateforme à définir ses fonctions, les fonctions de ses démembrements dans les secteurs et régions, les fonctions de ses membres et à mettre en place des règles démocratiques de fonctionnement. Au cours de ce PTA, le PADES et les ONG ont élaboré et harmonisé un plan de formation et son contenu sur le thème : la gestion organisationnelle. Le taux d'exécution est autour de 25% pour le PTBA.

#### **A230204 Appuyer les émissions radios**

Une convention de collaboration a été signée avec la « Radio communautaire PAPAGAIO » de Buba pour suivre les activités du PADES. Cette Radio a désigné un Point focal (journaliste) disponible en temps plein pour assister et diffuser toutes les activités du projet.

Durant cette année, des émissions radio ont été réalisées sur divers thèmes relatifs aux différentes activités du PADES : (i) rencontres avec les bénéficiaires ; (ii) entretiens avec des responsables des composantes ; (iii) visites de terrain du Ministre de l'Agriculture et Directeur Général de l'Agriculture ; (iv) des restitutions des études et ; (v) des annonces.

La radio PAPAGAIO a joué un rôle organisateur et formateur des différentes Organisations de Producteurs. Le taux d'exécution physique est de 100% pour le PTBA.

### **A230208 Tenir rencontres avec les partenaires techniques et prestataires de service**

Onze (11) rencontres ont été réalisées. Ce qui correspond à une rencontre par mois. Les sujets traités sont les suivants : (a) l'ingénierie sociale autour des sites réhabilités ; (b) l'élaboration des plans de formation ; (c) la validation du mémento du leader et ; (d) la restitution de l'Aide-Mémoire de Mission de la Revue à Mi-Parcours.

Ces rencontres d'échanges, de réflexions, d'analyses et de recommandations ont permis de faire : (a) la restitution du bilan d'activités 2018 ; (b) la planification des activités de 2019 ; (c) l'harmonisation de la méthodologie d'évaluation des activités menées par l'ensemble des acteurs, les OPB et les ONG. Elles ont également permis de souligner les points forts (succès), les points faibles (lacunes) des activités.

Le taux d'exécution physique est de 92% pour le PTBA.

#### **2.1.2.3 Volet A24 : Renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre**

L'objectif est de renforcer les capacités des partenaires et prestataires de services en matière de logistique et capacitations techniques des ressources humaines. Pour atteindre cet objectif les activités suivantes sont réalisées.

### **A240101 Signer les conventions avec les Directions régionales pour l'appui conseil**

Au cours de ce PTBA, le PADES a signé des conventions de partenariat avec les Directions Régionales de l'Agriculture des trois régions de la ZIP. Ces Directions Régionales de l'Agriculture doivent exécuter tout ce qui concerne l'animation, le suivi, le contrôle et appui-conseils des activités de leur zone respective.

Dans le cadre de cette convention, la DRA de Tombali a réalisé au profit de ses cadres une formation sur l'utilisation de GPS, tandis que la DRA de Bolama a reçu un appui institutionnel en matériel de bureau. Le taux d'exécution physique est de 100% pour le PTBA.

### **A240102 Contractualiser avec prestataires privés pour l'appui conseil**

Dans le cadre de la mise en œuvre ou du suivi des activités, le PADES s'appuie principalement sur les acteurs et opérateurs locaux, publics ou privés, qui réaliseront les activités d'animation, de formation, de sensibilisation et d'organisation des bénéficiaires. Pour chaque domaine d'activité il a été identifié les potentiels prestataires de services privés. Une liste restreinte de futurs prestataires avec expérience et compétence a été élaborée. Le budget initialement alloué à cette activité a été transféré selon la recommandation de mission de la revue à mi-parcours d'octobre 2018. Le taux d'exécution physique est de 15% pour le PTBA.

### **A240203 Appuyer la mise en place d'une chambre froide solaire**

L'activité a été conduite conformément aux procédures de passation des marchés en vigueur. La chambre sera équipée de 2 congélateurs, armoire de 960 litres et batteries avec leurs panneaux solaires. Le contrat de fourniture a été signé et les deux (2) congélateurs armoires ont été fournis. L'installation des panneaux solaires de la chambre froide est en cours de réalisation. Le taux d'exécution physique est de 90% pour le PTBA.

**A240207 Réaliser les études de réhabilitation du laboratoire et du magasin de stockage de semences**

L'activité, conformément aux procédures de passation des marchés en vigueur, a permis de contractualiser le cabinet. Les études de réhabilitation du laboratoire et du magasin de stockage de semences ont été réalisées et achevées.

**A240208 Réhabiliter le laboratoire de semences et magasin de stockage de semence à Contuboel**

L'activité, conformément aux procédures de passation des marchés en vigueur, a permis de contractualiser l'entreprise. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés et achevés. La réception provisoire du bâtiment a été effectuée.

**A240209 Suivre les activités de la convention par l'UCP**

À ce titre, sur vingt-quatre (24) missions prévues, dix (10) ont été réalisées au cours de cette année :

- ✓ deux(2) missions dans le cadre de concertation avec les partenaires ;
- ✓ une(1) pour la programmation conjointe des activités de la convention avec l'INPA ;
- ✓ deux(2) missions au Centre de Contuboel pour le suivi des travaux de réhabilitation du magasin de stockage et du laboratoire ;
- ✓ Deux(2) au Centre de Contuboel pour la récolte des 4 ha de semence et pour assister à la formation des multiplicateurs de semence ;
- ✓ Une (1) pour la réception provisoire du laboratoire et magasin de stockage de semence de Contuboel ;
- ✓ Deux (1) pour la prospection de la semence riz à Caboxanque et à Contuboel ;
- ✓ Deux (1) pour l'achat de 56 t semence riz à Caboxanque et à Contuboel.

Le taux d'exécution physique est de 50% pour le PTBA.

**A240210 Réaliser l'étude de réhabilitation de 13 ha de périmètres rizicoles**

L'étude de réhabilitation de 13 ha de périmètre rizicole au centre de recherche de l'INPA à Contuboel est achevée. Le rapport final est fourni.

**A240304 Assurer le suivi/supervision du projet par les Directions centrales des ministères concernés**

Pour l'exercice du PTBA 2018, des missions de supervision ont été réalisées par le Direction Générale d'Agriculture (DGA) et la Direction Générale d'Ingénierie & Développement Rural (DGIDR) afin de voir l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Au cours de ces missions, elles ont échangé avec l'entreprise CECO GB en charge des travaux de de réhabilitation des rizières de Gandua-Incomene sur le retard constaté des travaux dans cette rizière. Le taux d'exécution de l'activité est de 63% pour le PTBA.

**A240305 Assurer le suivi/supervision du projet par les Directions Régionales des ministères concernés**

Il s'agit d'organiser des missions de suivi des activités de la convention par les Directions régionales des ministères concernés. À cet effet, cinq missions de terrain ont été réalisées par la DRA de Quinara. Ces missions ont permis d'apprécier le niveau d'envahissement des insectes dans les champs rizicoles des bénéficiaires et de proposer les mesures de combat. À l'issue de ces missions, trois sessions de formation ont été organisées sur l'usage des pesticides, protection corporelle, le dosage des produits phytosanitaires au profit des producteurs des secteurs de Catió, Empada et Tite pour lutter contre les insectes dans les champs. Le taux d'exécution physique est de 14% pour le PTBA.

**A240307 Appuyer les ministères partenaires pour les visites d'échange à l'intérieur du pays**

Dans le cadre de cette activité, le projet a prévu d'appuyer les ministères partenaires dans l'organisation des visites d'échange à l'intérieur du pays. Pour ce semestre, une visite est prévue et devrait être organisée conjointement avec l'UCP et les ministères partenaires. Le budget initialement alloué à cette activité a été réalloué à d'autres activités selon la recommandation de mission de la revue à mi-parcours (RMP).

**2.2 Composante B : Appui à la valorisation des productions et accès au marché**

La composante B a pour objectif d'appuyer la valorisation des produits phares du projet et leur acheminement vers les marchés locaux et nationaux. La sous-composante B1 financera la promotion des métiers connexes et la valorisation post-récolte. La sous-composante B2 financera la construction et la réhabilitation de pistes rurales.

**2.2.1 Sous-composante B1 : Promotion de métiers connexes et d'activités de valorisation post-récolte**

La sous-composante B1 « Promotion des métiers connexes et activités de valorisation post-récolte » a pour objectifs : (i) de faciliter la consolidation d'un entrepreneuriat rural dans les chaînes de valeurs, offrant aux bénéficiaires du Projet des services d'approvisionnement en intrants et de mécanisation, et (ii) l'émergence d'opérateurs investis dans le traitement post-récolte du riz et la mise sur le marché des excédents de production.

**2.2.2 Sous-composante B2 : Construction et réhabilitation de pistes rurales**

L'effet attendu de cette sous-composante est l'amélioration de la mobilité des personnes et la mise en marché des produits de manière durable. Il s'agit de : (i) la réhabilitation de pistes pour desservir les zones d'intervention ; et (ii) la mise en place d'un ferry.

**2.2.2.1 Volet B21 : Réhabilitation de pistes rurales et acquisition de ferry**

En 2018 le projet prévoit la réhabilitation de quatre axes, Gandua-Tchugué, Gandua-Incomene, Aidara-Can et N2-Bissassema barrage qui correspondent à 32,3 km de pistes rurales et la mise en place d'un ferry entre São João et Bolama. Pour la mise en œuvre de ce volet, les activités suivantes sont prévues et réalisées :

#### **B210101 Signer convention avec la DGIT**

Dans le cadre de cette convention, la DGIT a effectué des missions de supervision pour la réhabilitation des pistes et a accompagné UCP-PADES dans l'évaluation et la sélection de l'entreprise qui réhabilitera le tronçon L33-Caboxanque de 11,7 km du secteur de Bedanda, région de Tombali. Le taux d'exécution physique est de 100% pour le PTBA.

#### **B210103 Contractualiser le Cabinet de contrôle des travaux**

Pendant l'exécution des travaux de réhabilitation des pistes rurales le cabinet DECO-IC est souvent resté sur place pour vérifier et contrôler l'état d'avancement d'activités.

En collaboration avec l'assistant technique national (ATN) du projet, des réunions hebdomadaires avec l'entreprise SOCOESTRADAS Lda ont été organisées pour analyser l'état d'avancement des travaux et vérifier leur conformité aux recommandations techniques de l'étude préparée à cette fin. Il a régulièrement soumis le rapport d'activité à l'UCP-PADES pour examen. Le taux d'exécution physique est de 80% pour le semestre et pour le PTBA.

#### **B210104 Réaliser les travaux des pistes**

L'entreprise SOCOESTRADAS Lda a achevé la réhabilitation de quatre (4) tronçons des 32,3 km de pistes rurales en construisant les valets longitudinaux et en béton sur les tronçons Aidará-Can (4,9 km), Gandua-Incomene (6,0 km) et Gandua-Tchugué (7,9) sauf le tronçon de Tite-Bissassema barrage (13,5 km). Le tableau 21 en annexe indique l'exécution des travaux réalisés sur les quatre (4) tronçons. Le taux d'exécution technique est de 81,22% pour le PTBA.

*NB : Concernant le tronçon L33-Caboxanque (11,7 km) qui doit être réalisé en 2019, l'UCP-PADES a lancé un appel d'offre international pour la sélection et la contractualisation d'une entreprise chargée de la réhabilitation de ce tronçon. Une commission créée à cet effet a sélectionné une entreprise. Le rapport d'appel d'offres a été envoyé au FIDA pour avis de non-objection.*

#### **B210106 Équiper les CITEP avec les petits matériels**

Pour équiper le CITEP, l'entreprise Global Services a été sélectionnée pour fournir les matériels ci-après mentionnés : 110 pelles, 110 brouettes, 110 pioches, 77 houes et 77 machettes. Ces matériels seront distribués aux CITEP de tronçons suivants : Aidará-Can, Gandua-Incomene, Gandua-Tchugué et Tite-Bissassema barrage. Le taux d'exécution physique est de 50% pour le PTBA.

#### **B210201 Conduire l'étude de faisabilité pour acquisition d'un ferry**

L'étude de faisabilité pour l'acquisition d'un ferry est conclue car les observations de la DGIT sont prises en compte pour améliorer le rapport. Le rapport définitif de cette étude est disponible. Le taux d'exécution physique est de 100% pour le PTBA.

### **2.3 Composante C : Coordination et Renforcement Institutionnel**

Cette composante vise à mettre en place le dispositif opérationnel du PADES pour assurer la programmation, la mise en œuvre des activités et son suivi-évaluation afin de garantir

l'atteinte des résultats, effets et impacts du projet sur les bénéficiaires dans les délais attendus et dans les zones ciblées.

### **2.3.1 Sous-composante C1 : Coordination et suivi-évaluation**

L'objectif de cette sous-composante est de mettre en place un système effectif de planification, gestion et évaluation participatives dans une démarche de partenariat local capable de mener à bien un développement durable.

#### **2.3.1.1 Volet C11 : Rénovation et construction de bureaux**

Les objectifs de ce volet sont de : (i) Coordonner la programmation et assurer la bonne exécution de l'ensemble des activités du projet ; (ii) Mobiliser et gérer les ressources du projet ; (iii) Assurer le suivi et évaluation des activités ; et (iv) Assurer l'animation du projet. Pour atteindre les objectifs de ce volet, il faut réaliser les activités suivantes :

##### **C110101 Élaborer le DAO et contrôler les travaux de bâtiment additionnel du siège (reliquat)**

Le cabinet en charge de contrôle des travaux de construction de bâtiment additionnel a conclu sa prestation après la réception provisoire. L'activité est achevée.

##### **C110102 Réaliser l'étude géophysique du forage**

En ce qui concerne l'étude géophysique du forage, l'évaluation et sélection des offres techniques et financières ont été effectuées, l'entreprise a été sélectionnée et l'étude est achevée. Le rapport final est disponible.

##### **C110103 Réaliser les travaux du forage**

Pour alimenter le siège du projet en eau potable, le PADES a réalisé les travaux de construction d'un forage. L'évaluation et la sélection des offres techniques et financières ont été effectuées, l'entreprise a été sélectionnée et les travaux ont été réalisés conformes aux exigences préétablis dans le TdR. Le taux d'exécution physique est de 100% pour le PTBA.

#### **2.3.1.2 Volet C12 : Coordination et suivi-évaluation**

L'objectif est de mesurer l'état d'avancement de l'exécution technique et financière des activités du projet.

Pour atteindre les objectifs de ce volet, les activités ci-dessous sont à réaliser :

##### **C120102 Organiser les sessions du Comité de Pilotage du projet**

Le Comité de Pilotage a été organisé le 21 décembre 2018 en vue d'examiner et approuver le Plan de Travail et de Budget Annuel (PTBA) 2019, ainsi que les rapports d'exécution technique, financière et de suivi-évaluation 2018 du PADES.

Cette activité a été organisée par l'UCP du PADES sous l'égide du Représentant de Son Excellence le Ministre de l'Agriculture et Développement Rural (MADR) et elle a regroupé plus d'une vingtaine de participants provenant de différentes structures de l'État, des

organisations non gouvernementales (ONG), des partenaires techniques et de l'équipe de l'UCP-PADES. À cet effet, le PTBA 2019 a été approuvé par les membres du comité de Pilotage. Le taux d'exécution de cette activité est de 100% pour le PTBA.

#### **C120103 Tenir un forum d'orientation sur le projet**

L'objectif de ce premier forum est d'assurer la participation de l'ensemble des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre du projet. L'UCP est responsable de la mise en œuvre du Forum d'Orientation. Une réunion a été prévue entre octobre et décembre 2018. La rencontre doit prendre en compte la participation des partenaires et bénéficiaires de la zone d'intervention du projet. Il s'agit d'un organe intégrant tous les acteurs présents (autorités locales et traditionnelles, ONG, IOR, structures déconcentrées de l'administration, secteur privé, autres organisations de la société civile, leaders religieux et les bénéficiaires). La présence de mission de la revue à mi-parcours en octobre et l'élaboration du PTBA 2019 en novembre n'ont pas permis la réalisation de cette réunion si importante pour le projet.

#### **C120105 Conduire les ateliers de consolidation du PTBA au niveau régional**

Au cours de cette année, l'UCP n'a pas parcouru toutes les trois (3) régions comme prévu. Mais Cette activité a eu lieu lors d'organisation de l'atelier du Comité de Pilotage. À cet atelier, les gouverneurs, les directeurs régionaux de l'agriculture et les cinq (5) ONG des trois (3) régions (Tombali, Quínara et Bolama/Bijagós) ont examiné et approuvé le Plan de Travail et de Budget Annuel (PTBA) 2019 du PADES. Le taux d'exécution physique de l'activité pour le PTBA est de 100%.

#### **C120106 Conduire les ateliers d'élaboration du PTBA au niveau central**

Cette activité a eu lieu lors de l'organisation de l'atelier du Comité de Pilotage dont l'orientation stratégique, l'adaptation des plans de travail et budget annuel 2019, la validation des actions à mettre en œuvre, des rapports d'exécution technique et financière et de suivi-évaluation 2018 ont été validés. Le taux d'exécution physique de l'activité pour le PTBA est de 100%.

#### **C120107 Suivre/superviser les activités par l'UCP**

L'activité permet à l'équipe technique et au coordonnateur du Projet de suivre et superviser travaux sur le terrain. À cet effet, des missions de terrain ont été effectuées au cours de cette année. Ces missions ont permis :

- De constater :
  - ✓ Le grand retard de l'avancement des travaux de réhabilitation des rizières de Gandua-Incomene ;
  - ✓ Un déplacement des équipements/matériels vers d'autres sites par l'entreprise ;
  - ✓ Un manque de personnels sur le chantier.
- D'organiser une réunion afin de discuter de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation à Gandua-Incomene. Cette réunion s'est tenue avec la participation de

l'équipe du PADES, la Direction Générale d'Ingénierie & Développement Rural (DGIDR), Direction Générale d'Agriculture (DGA) et l'entreprise CECO GB en charge des travaux de réhabilitation des rizières de Gandua-Incomene. À l'issue de cette réunions, des recommandations ont été effectuées à l'Entreprise CECO GB:

- ✓ Rassembler tous les équipements/matériels sur le site ;
- ✓ Ne plus déplacer les équipements/matériels vers d'autres sites tant que les travaux ne sont pas achevés ;
- ✓ Recruter le personnel qui sera en mesure de faire avancer les travaux ;
- ✓ Achever les travaux à la date prévue.

Elles ont permis également de suivre et contrôler les résolutions prises lors du premier semestre concernant le retard accusé sur l'avancement des travaux de réhabilitation de deux (2) rizières de mangrove type moderne (Gandua-Incomene & Bissassema-Nhala) et d'organiser la cérémonie de l'ouverture du déchargeur à cinq (5) tuyaux de la rizière de Gandua-Incomene en présence du Ministre de l'Agriculture et Développement Rural. Le taux d'exécution est de 100% pour le PTBA.

#### **C120109 Tenir des comités de suivi technique sur le projet**

Le PTBA 2018 a été élaboré de manière participative. L'UCP, les partenaires techniques (ONG, DRA), les représentants des bénéficiaires et leurs groupements, les autorités administratives locales et coutumières (Gouverneurs de Région, Administrateurs de Secteur et les représentants du pouvoir traditionnel) ont participé activement à son élaboration.

Pour la bonne exécution du PTBA, l'UCP a mis en place avec toutes les parties prenantes, un comité chargé de suivre sa mise en œuvre. Ce comité se réunira par trimestre dans chacune des régions du projet pour, faire le point de l'exécution des activités programmées, identifier les points de blocage éventuels et proposer des solutions pour les lever.

Cette activité n'a pas eu lieu suite à des programmes trop chargés par rapport à l'UCP et ainsi que toutes les parties prenantes.

#### **C120110 Assurer l'appui d'assistant technique international au service suivi et évaluation**

Au titre de cette activité, l'assistant technique international a été recruté pour une durée de huit (8) mois qui a comme tâches : (i) assister le Service de S&E ; (ii) aider le Service S&E à collecter les données ; et (iii) former le Responsable S&E et son assistant sur le logiciel EASY DATA. Une première prestation de six (6) mois a été réalisée de mai à décembre 2018. Le taux d'exécution est de 72% pour le PTBA.

#### **C120201 Recruter assistant technique international (ATI) en planification de courte durée**

Au titre de cette activité, l'assistant technique international en planification a été recruté pour une durée de huit (8) mois et ayant comme tâches (i) assister l'UCP ; et (ii) aider l'UCP à



maitriser la planification. Une première prestation de six (6) mois a été effectuée de mai à décembre 2018. Le taux d'exécution est de 75% pour le PTBA.

**C120202 Recruter l'Assistant Technique International (ATI) en comptabilité, administration et finances de courte durée**

Dans le cadre de cette activité, le projet a recruté un assistant technique en comptabilité, administration et finances et ayant comme tâches (i) assister en comptabilité ; et (ii) préparer le rapport des audits comptables et financiers. Une deuxième prestation d'un (1) mois a été effectuée en octobre 2018 pour préparer au préalable la mission de la revue à mi-parcours. Le taux de réalisation est de 100% au le PTBA.

**C120203 Recruter l'Assistant Technique International (ATI) en passation des marchés courte durée**

Le projet a prévu de recruter un assistant technique (ATI) de courte durée en passation des marchés en vue d'aider le responsable de passation des marché à faire une meilleure gestion de passation de marché du projet. Cette activité n'a pas eu lieu à cause de départ du responsable de passation de marchés et le recrutement effectif du nouveau responsable de passation de marchés a eu lieu en octobre 2018.

**C120204 Recruter l'Assistant Technique International pour TOM2PRO de courte durée**

Concernant cette activité, l'assistant technique International en Tom2Pro de courte durée a été recruté en deux prestations de service entre juillet et décembre 2018. Cette assistance concerne sur l'appui au service administratif et comptabilité pour une meilleure maitrise du logiciel Tom2Pro du projet. Le taux d'exécution de cette activité pour le PTBA est de 100%.

**2.3.1.3 Volet C14 : Acquisition du matériel/outils informatiques**

Pour le bon fonctionnement du projet sur toute sa durée, le PADES a prévu équiper tous ses services et agents en matériels de bureaux et en outils informatiques.

**C140101 Acquérir matériel et mobilier de bureau**

Il s'agit d'acquérir les lots de matériel et équipement pour assurer le fonctionnement du projet. Les matériels et mobilier de bureau ont été acquis dont : cinq (5) armoires métalliques avec 2 portes, cinq (5) chaises roulantes, dix (10) chaises fixes, six (6) corbeilles à ordures, quatre (4) corbeilles à déchets avec pédale et cinq (5) bureaux avec 2 tiroirs. Le taux d'exécution est de 100% de réalisation pour le PTBA.

**C140102 Mobilier pour les chambres**

Il s'agit d'acquérir des lots de mobilier et équipement pour assurer le fonctionnement des chambres de passage du projet. Les matériels et mobilier de bureau ont été acquis. Le taux d'exécution est de 100% de réalisation pour le PTBA.

### 2.3.1.4 Volet C15 : Étude thématique

Ce volet permet de réaliser des enquêtes annuelles pour mesurer des résultats (EAR) et faire des collectes de données quantitatives et qualitatives à l'aide des outils élaborés par le service suivi-évaluation en vue de disposer de données pour apprécier l'avancement du projet.

#### **C150103 Réaliser l'enquête annuelle sur les résultats (EAR)**

Il s'agit de réaliser l'enquête annuelle sur les résultats atteints par le projet. Cette activité est programmée pour être réalisée en février 2019. Donc le taux d'exécution physique pour le PTBA est estimé à 0%.

#### **C150105 Réaliser les collectes périodiques des données pour le système du suivi-évaluation**

Cette activité vise à réaliser les collectes périodiques des données pour le service de suivi-évaluation afin de les traiter, les analyser, documenter et partager.

Au cours de cette année, le service suivi-évaluation a organisé plusieurs enquêtes d'évaluation rapide et recensements. Il s'agit : (i) Évaluation rapide des ONG par les bénéficiaires ; (ii) Évaluation rapide des DRA (Directions Régionale de l'Agriculture) par les bénéficiaires ; (iii) Évaluation rapide des agents du PADES par les bénéficiaires ; (iv) Évaluation rapide de l'alphabétisation par les bénéficiaires ; (v) Évaluation rapide de l'INPA par les bénéficiaires - ; (vi) recensement des éleveurs de la Zone d'Intervention du Projet (ZIP) ; (vii) les mesures de superficies/parcelles des agriculteurs des différentes rizières réhabilitées et ; (viii) le carré de rendement.

Concernant (i) l'évaluation rapide des ONG par les bénéficiaires, de façon générale 85,77% des enquêtés affirment que les ONG suivent leurs associations dans la zone du projet. ;

Au niveau (ii) de l'évaluation rapide des DRA par les bénéficiaires, de façon globale, l'analyse du suivi des activités des bénéficiaires par les DRA indiquent seulement que 39,18% des bénéficiaires ont été visités.

S'agissant (iii) de l'évaluation rapide des agents du PADES par les bénéficiaires, 83,06% des enquêtés affirment que le PADES suit leurs activités dans la zone du projet

(iv) l'évaluation rapide de l'alphabétisation par les bénéficiaires montre que plus de 90% des apprenants savent lire et écrire, voir le tableau 14 en annexe.

Au niveau (v) de l'évaluation rapide de l'INPA par les bénéficiaires, 90% des multiplicateurs de semences de riz enquêtés déclarent que l'INPA suit leurs activités sur le terrain.

(vi) le recensement des éleveurs de la Zone d'Intervention du Projet a permis d'enregistrer 372 éleveurs dont 141 femmes, 231 homme et 155 jeunes (tous sexes confondus). Ces éleveurs sont repartis par région comme suit : (a) région de Bolama/Bijagós, secteur de Bolama (74) ; (b) région de Tombali, secteurs de Catió (55) et Bedanda (69) ; (c) région de Quinara, secteurs de Tite (93) et Empada (81). Ils ont tous à leur actif au total 424 têtes d'animaux (volaille, caprin, ovin, porc et autre), voire le tableau 17 en annexe.

S'agissant (vii) les mesures de superficies/parcelles des agriculteurs des différentes rizières réhabilitées, le PADES a recensé 1 747 paysans dont 480 femmes, 1 269 hommes et 571

jeunes (tous sexes confondus) sur tous les sites aménagés. Ces paysans exploitent au total 2 765,20 ha sur 4 774 ha aménagés (basfonds et mangrove), voir le tableau 18 en annexe.

(viii) le carré de rendement a été posé sur les sites aménagés des différents secteurs : (a) secteur de Catió les rizières de Timbo 1 (1,5 t/ha), Gandua-Incomene (1,23 t/ha) et Cubumba (1,47 t/ha) ; (b) secteur d'Empada les rizières de Darsalame (1,91 t/ha) et Madina Gantumane (1,91 t/ha) ; (c) secteur de Bedanda les rizières de Caboxanque (2,25 t/ha) et de Bedanda (2,43 t/ha) ; et (d) le secteur de Tite la rizière de Bissassema-Nhala (1,32 t/ha). Le taux d'exécution physique est de 100% pour le PTBA.

#### **C150201 Organiser des missions diverses du terrain de suivi-évaluation**

Cette activité vise à assurer les missions de terrain du SS&E pour le suivi effectif des activités menées dans les différents secteurs de la zone d'intervention du projet.

Au cours de cette année, l'équipe technique et le suivi-évaluation du Projet ont effectué plusieurs missions de terrain. Ces missions ont permis de : (i) suivre le déroulement du stockage et distribution de semences du riz dans les différents secteurs des 8 rizières réhabilitées ; (ii) réaliser les rencontres avec les partenaires de mise en œuvre du projet et les bénéficiaires en générale ; (iii) récupérer la fiche de distribution de semences de riz pour connaître le nombre des producteurs ayant reçu les semences; (iv) suivre la mesure de superficie exploitée par chaque paysan ; (v) suivre la distribution des semences maraîchères et ; (vi) suivre la distribution de l'engrais.

Toutefois, une mission de suivi des OPB a été réalisée au cours de laquelle l'équipe a échangé avec :

- ❖ quinze (15) CDIT dont neuf (9) dans le secteur d'Empada, quatre (4) dans le secteur de Catió et deux (2) dans le secteur de Bedanda,
- ❖ sept (7) CGB dont deux (2) à Empada, trois (3) à Catió et deux (2) Bedanda
- ❖ trois (3) CITEP dont un (1) à Catió, un (1) à Empada et un (1) à Bedanda

Ces échanges ont porté sur les thèmes suivants : (i) le fonctionnement et organisation des OPB ; (ii) l'existence des textes fondateurs et la connaissance de leurs contenus par les organes & leurs membres. L'analyse de ces échanges montre de façon générale : (a) qu'aucune des OPB visitées ne dispose de statuts, de règlemente intérieur et ni programme de travail, (b) 64% des OPB organisent des réunions de organes mais 16% disposent le PV et la liste de présence des réunions et ; (c) 20% des OPB disposent des PV de constitution. La composition diffère d'un secteur à un autre. Les recommandations effectuées sont :

- Au niveau de l'ingénierie sociale : (i) mettre en place un modèle de statuts, de règlements intérieurs, de PV de constitution et des réunions des OPB ; (ii) organiser le renforcement des capacités des membres des organes des OPB sur la gestion organisationnelle ;
- Au niveau des ONG : respecter le calendrier de mise place des OPB, respecter la composition des bureaux et les critères de mise en place OPB prescrit par le PADES, aider les OPB à établir leurs programmes de travail ;
- Au niveau du SS&E : organiser des missions de suivi régulières des OPB ;

- Au niveau des OPB : organiser des réunions de bureau et faire les PV de réunions & liste de présence.

Par ailleurs, l'équipe a échangé pendant ces missions avec les partenaires locaux de mise en œuvre du Projet (ONG, DRA, CGB CDIT et la communauté en générale) sur la quantité de semences distribuée (riz, engrais et maraichères), la mesure des superficies exploitées par les paysannes des rizières aménagées. Dans ces rencontres, il y a eu environ 625 participants, dont 145 femmes et 358 jeunes (tout sexe confondu).

Le taux d'exécution physique de cette activité est de 100% pour le PTBA.

#### **C150202 Assurer les audits techniques externes du projet**

Il s'agit de réaliser l'audit des activités, ressource humaine du projet PADES et de concrétiser l'appui à la mise en place d'un système de contrôle de gestion.

#### **C150203 Organiser les missions de supervision conjointe Gouv-FIDA**

Une mission conjointe du Gouvernement de Guinée-Bissau et du Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) pour la Revue à Mi-Parcours (RMP) du PADES, a été organisée du 08 au 29 octobre 2018. Elle avait pour objectif principal d'évaluer la performance de l'exécution globale du projet & les résultats atteints à mi-parcours et de guider la coordination du projet afin d'atteindre les résultats prévus. Cette activité a permis de faire le point à la fois technique, financier et comptable de l'ensemble du projet.

Par ailleurs, la passation de services entre M. Vincenzo GALASTRO et M. Gianluca CAPALDO, respectivement CPM sortant et CPM entrant pour la Guinée-Bissau, a eu lieu au cours de cette mission.

Le taux d'exécution physique de l'activité est de 50% pour le PTBA.

#### **C150204 Organiser la mission de la Revue à Mi-Parcours du projet**

Du 08 au 29 octobre, une mission de la revue à mi-parcours s'est déroulée en Guinée-Bissau, concrètement dans le secteur de Buba, région de Quinara. La mission a visité un échantillon représentatif des réalisations du projet dans les régions de Quinara et Tombali. Elle a rencontré les partenaires clés du PADES à savoir : (i) les Autorités locales ; (ii) les bénéficiaires incluant des représentants des organisations de producteurs de base et ; (iii) les partenaires techniques d'exécution (Directions Régionales en charge du Génie Rural et de l'Agriculture et ONG), les entreprises en charge des travaux et le bureau de contrôle des pistes rurales.

Cette mission a permis de faire le point à la fois technique, financier et comptable de l'ensemble du projet. Toutefois, il faut souligner qu'au cours de cette mission, le projet se retrouve avec des ressources financières insuffisantes pour réaliser les activités prévues jusqu'à son achèvement en 2021. En effet, les projections sur l'exécution financière cumulée jusqu'au 31 décembre 2018 montrent un solde disponible estimé seulement à 1 300 000 USD sur les fonds du prêt et don FIDA. Ce solde suffit à peine pour couvrir les dépenses du projet pour l'année 2019 dans l'hypothèse d'une équipe légèrement réduite du PADES. L'opérationnalisation d'un plan d'action 2019-2021 nécessite la mobilisation d'un montant additionnel d'environ 5 millions USD. Le taux d'exécution physique de cette activité pour le PTBA est de 100%.

#### **C150208 Organiser l'atelier de restitution pour les résultats des données**

Cette activité vise à organiser les ateliers de restitution dans les régions/secteurs de la zone d'intervention du projet pour rendre aux bénéficiaires les résultats des données atteints par le projet chaque trimestre. Une mission a été organisée dans ce semestre composé d'équipe de suivi évaluation et les techniciens dans les régions de Tombali (secteurs de Catió et Bedanda) et Quinara (secteurs de d'Empada et Tite). Il y a eu une participation de 43 Organisations Paysannes de Base (OPB) : 26/49 CDIT, 12/13 CGB et 5/5 CITEP. Le taux d'exécution physique 25% pour le PTBA.

#### **C150209 Organiser les missions d'extension de PADES à Bijagós**

La mission s'est déroulée en décembre 2017. Le rapport définitif de la mission a été fourni en janvier 2018. Cette activité est achevée.

#### **C150301 Assurer les audits comptables et financiers**

Cette activité vise à assurer les audits comptables et financiers du PADES chaque année. Au cours de ce semestre, le consultant est recruté et l'audit a été réalisé. Le rapport final est disponible et transmis au FIDA.

### **2.3.1.5 Volet C16 : Formation et voyage d'échanges**

L'objectif de ce volet est de réaliser d'une part, le renforcement des capacités des agents de l'UCP à l'étranger sur des thématiques spécifiques dans des centres de formations spécialisés ou au cours des ateliers internationaux organisés à cet effet ; et d'autre part, d'organiser en interne des séances de formation adaptées à leurs postes respectifs. Ces formations seront complétées par des échanges d'expérience à l'international ou à l'intérieur du pays dans les projets similaires.

#### **C160101 Renforcer les capacités de l'UCP à l'étranger**

Au cours du semestre, quatre (4) personnes de l'UCP (Coordonnateur, Responsable Administrative et Financière (RAF), Responsable de Passation de Marchés et Assistant Suivi-Évaluation) se sont rendus à Dakar/Sénégal pour un atelier de quatre (4) jours sur le renforcement des performances des projets. Cet atelier a été organisé par le Bureau sous régional du FIDA pour l'Afrique de l'Ouest. Il a rassemblé sept pays, à savoir, le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie, le Mali, la Guinée-Bissau et la Guinée. L'objectif de cet atelier est de passer en revue l'état de mise en œuvre des projets en cours et préparer l'année 2019, pour augmenter la performance et l'impact desdits projets. Le taux d'exécution physique de cette activité est de 60% pour le PTBA.

#### **C160102 Renforcer les capacités de l'UCP dans le pays**

Concernant cette activité, le plan de renforcement des capacités élaboré par le PADES et approuvé en même temps que le PTBA 2018 est mis en œuvre. En effet l'UCP a bénéficié de trois appuis techniques du FIDA : assistance en comptabilité, en planification et en suivi-évaluation en vue d'améliorer la mise en œuvre du projet. Le taux d'exécution physique est de 45% pour le PTBA.

### **C160103 Former les acteurs (DRA, CDIT et ONG) impliqués en matière de suivi-évaluation**

Au cours de ce semestre, le service suivi-évaluation a organisé plusieurs formations des partenaires techniques (DRA, CDIT et ONG) de mise en œuvre du Projet. Ces formations ont été sur les thèmes suivant : (i) utilisation de GPS pour la mesure des superficies exploités par les paysans ;(ii) utilisation de la fiche de recensement des éleveurs ; (iii) la mesure du carré de rendement ;(iv) et l'utilisation des différentes fiches d'enquête (les évaluations rapides des ONG, de l'INPA, des agents de PADES et de l'alphabétisation). Au total, 86 bénéficiaires dont 21 femmes, 65 hommes et 72 jeunes (tout sexe confondu) ont participé aux différentes formations. Le taux d'exécution physique est 100% pour le PTBA.

### **2.3.2 Sous-composante C2 : Mise à échelles des CDIT**

La sous-composante C2 vise la mise à l'échelle du modèle des Comités de Développement Intégré des Tabancas (CDIT) afin de les ancrer dans la dynamique économique et entrepreneuriale du PADES.

#### **2.3.2.1 Volet C21 : Amélioration et extension des CDIT**

L'objectif de ce volet est la mise à l'échelle des CDIT et OP qui passent nécessairement par la structuration de ces entités rurales qui jouent un rôle stratégique, organisateur de la vie communautaire et de soutien aux initiatives privées.

### **C210102 Créer les centres d'alphabétisation fonctionnelle**

Cette activité permet de créer des centres d'alphabétisation fonctionnels dans les villages où le besoin se fait sentir. C'est dans cette optique qu'une mission de diagnostic participatif a été réalisée dans les villages de Biassa, Madina de Baixo, Darsalame, Caur de Cima et Gancumba Beafada afin de déterminer le village pouvant abriter le centre d'alphabétisation. C'est ainsi qu'un centre d'alphabétisation a été créé à Biassa dans le secteur d'Empada. Cette mission a permis : (i) de sensibiliser la communauté pour une ouverture d'un nouveau centre ; (ii) d'orienter la communauté pour identifier les facilitateurs ; (iii) d'inscrire les participants ; et (iv) de Communiquer les engagements de chaque partie. En somme, on a enregistré 176 participants dont 114 femmes, 62 hommes et 47 jeunes (hommes et femmes). Le taux d'exécution est de 100% pour le PTBA.

### **C210103 Former les CDIT sur diverses thématiques (élaboration des dossiers de DMP, Passation des marchés, S&E, IEC, Audit, Genre, Groupement de femmes et jeunes, etc.)**

Cette activité a été incluse dans la formation des OPB. Ce sont des femmes membres des CDIT, CGB, CITEP et CGP qui ont été formées sur le thème : qualification des femmes dans les organes créés au sein du village. Parmi les participants, il y a vingt-six (26) femmes et trois (3) animateurs de l'ONG. Le taux d'exécution physique est de 40 et pour le PTBA.

### **C210106 Organiser une campagne de commémoration de la journée Internationale des femmes**

Du le 6 au 8 mars 2018, l'équipe d'Ingénierie sociale en collaboration avec le suivi-évaluation ont organisé une campagne de commémoration de la Journée Internationale des Femmes à Catió. L'administration locale, la Plateforme de Réseau des Femme et les Radio Bombolom et Papagaio ont tous participé à cette journée de commémoration. L'objectif de la rencontre est porté sur l'égalité de genre et la promotion de l'autonomisation des femmes. Cette cérémonie étant la première dans le secteur de Catió a été jugée satisfaite par l'ensemble des femmes participantes. Ces femmes ont évoqué l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes : « *Il faut travailler ensemble pour améliorer la situation des femmes rurales. L'autonomisation des femmes est essentielle pour le développement de l'agriculture* », disent-elles.

Par ailleurs, l'équipe d'Ingénierie sociale a organisé également une formation afin de promouvoir le genre dans la zone d'intervention du projet. Cette formation s'est déroulée à Buba dans la région de Quinara sur le thème « Participation des femmes qualitativement aux réunions des structures de base ». Au total, 77 participants étaient présents dont 67 femmes et 2 hommes des 17 villages dudit secteur. Le taux de d'exécution de l'activité est estimé et 26% pour le PTBA.

### **C210107 Animer les centres d'alphabétisation fonctionnelle**

Durant ce l'exercice ce PTBA, sur la base d'une convention de collaboration entre le PADES et Direction Générale de l'Alphabétisation et Éducation Non Formelle (DGAENF) du MEN, 4 (quatre) missions de suivi et évaluation des centres créés ont été réalisées. Ces missions ont permis de faire : (i) l'observation de la classe ;(ii) la vérification du plan de cours des animateurs et des cahiers des apprenants ;(iii) l'identification les difficultés des animateurs et des apprenants ;(iv) le contrôle technique pédagogique du facilitateur ; (v) et la sensibilisation de la communauté au non-abandon des cours d'alphabétisation. Par ailleurs, le projet a organisé la formation de deux (2) facilitateurs en Alfa TV pour le nouveau centre

On enregistre : (a) 227 apprenants du niveau 1 dont 126 amis, 22 redoublants et 79 abandons ; (b) et 168 apprenants de niveau 2 dont 123 amis, 12 redoublants et 33 abandons.

Sur 395 apprenants au total, il y a 115 dans le secteur de Tite, 75 dans le secteur de Bolama, 46 dans le secteur d'Empada, 50 dans le secteur de Bedanda et 109 dans le secteur de Catió. Voir le tableau 14 en annexe.

### **C210203 Soutenir réunion de restitution des études APS/APD, DAO**

Cette activité permet d'organiser des réunions de restitution des études APP/APD, DAO afin que les avis des participants soient pris en compte dans le rapport final. Au cours de ce PTBA, les restitutions des résultats de l'étude de la rizière de Gã Cumba-São Miguel incluent 6 autres villages que travaillent dans la même rizière ont été organisé dans le secteur d'Empada avec 24 participants dont 2 femmes, 22 hommes et 8 jeunes (tous sexes confondus). Le taux d'exécution physique de cette activité est de 63% pour le PTBA.

### III. ANALYSE DES RESULTATS ATTEINTS

**Programme de calcul du taux de réalisation physique** : un coefficient de pondération est attribué à chaque activité selon son montant dans le budget 2018. Plus le montant est grand plus le coefficient est élevé voir le tableau 5.

Le programme d'activité du deuxième semestre de l'année 2018 a été pour l'essentiel recentré autour des investissements structurants (aménagement hydro-agricole et réhabilitation de pistes rurales) et de l'ingénierie sociale.

De façon générale, le taux d'exécution technique des activités de toutes les composantes confondues s'élève à 80,82% sur le PTBA 2018. De façon détaillée, le taux d'exécution technique des activités par composante se présente comme suit :

#### **Composante A**

Le taux d'exécution technique des activités de la composante A est de 80,72% pour le PTBA 2018. Ce taux peut être expliqué par plusieurs raisons dont les plus importantes sont énoncées ci-après :

- Les réhabilitations des rizières de types traditionnels sont achevées ;
- Les réhabilitations des rizières de types modernes sont bien avancées ;
- Les réhabilitations des rizières des basfonds ont été achevées ;
- Plusieurs études programmées sont réalisées.

#### **Composante B**

Le taux d'exécution technique des activités de la composante B est de 83,9% pour le PTBA 2018. Ce taux peut être expliqué par le fait que l'exécution des travaux de pistes rurales est très avancée.

#### **Composante C**

Le taux d'exécution technique des activités de la composante C est autour de de 80,34% pour le PTBA 2018. Le taux de cette composante peut être expliqué par plusieurs raisons dont les plus importantes sont énoncées ci-après :

- Les recrutements des ATI ont été effectués ;
- Dans l'ensemble, la plupart des activités de cette composante sont achevées et ;
- Le suivi et exécution du Plan de Passation de Marchés (PPM) dans le temps.

Concernant de l'exécution physique, le taux de réalisation de 80,82% ont été impacté positivement par le suivi de décaissement et les missions de suivi régulière des travaux sur le terrain.



#### **IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS PROPOSÉES**

Ci-dessous sont indiquées les principales difficultés rencontrées au cours de ce PTBA 2018 :

- un certain retard dû à la présentation de la garantie bancaire par les entreprises sélectionnées ;
- un retard au niveau de démarrage et de l'avancement des travaux d'aménagements des sites sélectionnés du projet par l'entreprise CECO-GB ;
- la suspension des travaux de la rizière de Mansane (126 ha) causée d'une part par un désaccord entre les paysans et entreprise sélectionnée pour la réalisation des travaux de construction de digues de rétention d'eau et d'autre part par l'état très sec et dur du sol de la rizière qui rend très difficile l'aménagement;
- les retards des signatures des contrats de prestations de service, des conventions de partenariat avec les services privés et étatiques, qui sont les partenaires de mise en œuvre du projet ;
- le retard dans la mise en œuvre du PPM ;
- la résiliation, par le Ministère avec l'accord du FIDA, du contrat des Responsables de Suivi-évaluation et du Passation de marchés.

**2<sup>ÈME</sup> PARTIE**

**EXECUTION FINANCIERE  
JANVIER - DÉCEMBRE 2018**

Cette partie du rapport fait le point de l'exécution financière du Projet d'Appui au Développement Économique des Régions du Sud (PADES) pour la période du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2018.

On souligne que le budget annuel 2018 a été arrêté à la somme de **2 915 742 886 F CFA** après la prise en compte des amendements du Comité de Pilotage et des observations formulées par le Bailleur de fonds. Ce budget financé par trois (3) bailleurs de fonds est réparti comme suit :

- État Bissau Guinéen	:	<b>337 304 588 F CFA</b>
- FIDA	:	<b>2 480 348 798 F CFA</b>
- Bénéficiaires	:	<b>98 089 500 F CFA</b>

Ce chapitre comprend :

- Les développements nécessaires et explicatifs concernant l'utilisation des fonds mis à la disposition du Projet.
- Des tableaux chiffrés montrent les réalisations constatées depuis 01/01/2018 jusqu'au 31/12/2018, et les ratios significatifs.

Il s'articule successivement autour des points suivants :

- La situation de l'exécution de la passation des marchés ;
- La situation des décaissements pour la période couverte par ce rapport ;
- La situation de l'exécution budgétaire du 01/01/2018 jusqu'au 31/12/2018 qui dégage les taux de réalisation au niveau de chaque rubrique budgétaire. L'analyse est effectuée par composante et par catégorie de dépenses ;
- La situation des comptes du Projet.

## V. SITUATION DE L'EXÉCUTION DE LA PASSATION DES MARCHÉS

Le plan de passation des marchés de l'année 2018 compte 54 marchés prévus dont 13 marchés de biens, 33 de services de consultants et 8 de travaux. Sur les 54 marchés inscrits au plan de passation des marchés, 38 marchés ont été réalisés.

La situation globale selon les composantes et les types de marchés se présente comme l'indique le tableau 3 ci-après :

**Tableau 2 : Situation de l'exécution du PPM (Janvier - Décembre 2018)**

Types de marchés		Composante A	Composante B	Composante C	Total	Taux de réalisation par type de marchés (%)
1 – TRAVAUX	Prévu	6	1	1	8	<b>88%</b>
	Réalisé	5	1	1	7	
2 – BIENS	Prévu	9	1	3	13	<b>62%</b>
	Réalisé	5	0	3	8	
3 – CONSULTANTS	Prévu	16	4	13	33	<b>70%</b>
	Réalisé	11	2	10	23	
<b>TOTAL</b>	Prévu	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>54</b>	<b>70%</b>
	Réalisé	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	
<b>Taux d'exécution par composante</b>		<b>68%</b>	<b>50%</b>	<b>82%</b>	<b>70%</b>	

De façon générale jusqu'à la date du 31 Décembre 2018, le taux d'exécution selon les types de marchés est de 62% pour les marchés de biens (fournitures), 70% pour les marchés de Consultance (prestations de services) et 88% pour les marchés de travaux.

Par rapport aux composantes, on enregistre les taux suivants : Composante A : 68%, Composante B : 50% et Composante C : 82%.

De l'analyse du tableau 3 ci-dessus, il ressort que huit (08) contrats de fournitures de biens, vingt-trois (23) marchés de services consultants et sept (07) contrat de travaux ont été réalisés.

On souligne que certains marchés ont connu des retards durant leurs processus particulièrement à l'étape du lancement.

Il faut souligner qu'il y a eu une amélioration du processus de passation de marché, au cours du deuxième semestre dû : (i) au recrutement du Responsable de Passation de Marché ; et (ii) au suivi mensuel rigoureux du PPM et la proactivité dans son exécution par le Coordonnateur et à l'Assistant de suivi-évaluation jusqu'au recrutement du responsable de passation.

## VI. SITUATION DES DÉCAISSEMENTS DU DEUXIÈME SEMESTRE

### 6.1 Demandes de décaissement traitées au cours de premier semestre

En ce qui concerne la mobilisation des fonds le projet a pu traiter six (6) Demandes de Retrait de Fonds (DRF) et sept (7) Demandes de Paiement Directe (DPD) pour une valeur globale de : 3 220 203 052 F CFA. Voir le tableau ci-après pour plus de détails.

**Tableau 3: DRF / DPD traités et soumis au bailleur en 2018**

Nbre	Bénéficiaire	Bien ou service et période couverte	Date de soumission	Valeur, XOF	État de traitement
DRF N° 0010	PADES	Demande de Retraite de Fond	16/01/2018	83 187 572	payé
DRF N° 0011	PADES	Demande de Retraite de Fond	01/02/2018	145 607 418	payé
DPD N° 0012	DECO IC	Solde de 50% du contrat sur étude de 47 km des pistes rurales	05/03/2018	48 787 500	payé
DPD N° 0013	NSIA ASSURANCES	Paiement de différents types d'assurances	05/03/2018	59 084 515	payé
DRF N° 0014	PADES	Rehaussement du compte désigne	05/03/2018	407 000 000	payé
DPD N° 0015	SOCOESTRADAS Lda	Paiement de 20% du contrat par rapport avance de démarrage	30/04/2018	326 722 412	payé
DRF N° 0016	PADES	Demande de Retraite de Fond	25/05/2018	321 220 740	payé
DPD N° 0017	ECOMAR	Paiement 20 tonnes d'engrains & tuyaux	18/06/2018	57 480 000	payé
DRF N° 0018	PADES	Demande de Retraite de Fond	23/08/2018	327 701 504	Dans le DRF N° 0018 FIDA a payer 4 000 FCFA de plus par rapport au montant réelle de la DRF
DPD N° 0019	SOCOESTRADAS Lda	Paiement de 30% du contrat de travaux de réhabilitation de 32,3 km des pistes rurales	04/09/2018	365 486 088	payé
DRF N° 0020	PADES	Demande de Retraite de Fond	02/10/2018	371 625 064	payé
DRF N° 0021	PADES	Demande de Retraite de Fond	11/12/2018	235 721 011	non payé
DPD N° 0023	SOCOESTRADAS Lda	Paiement de 20% du contrat de travaux de réhabilitation de 32,3 km des pistes rurales	03/12/2018	276 883 400	payé
DPD N° 0024	SOCOESTRADAS Lda	Paiement de 20% du contrat de travaux de réhabilitation de 32,3 km des pistes rurales	27/12/2018	276 883 400	non payé
<b>Total</b>				<b>3 303 390 624</b>	

## 6.2 Demandes de décaissement payées au cours de l'année

Les Demandes de Paiement Directe (DPD N° 0012, DPD N° 0013, DPD N° 0015, DPD N° 0017, DPD N° 0019 & DPD N° 0023), et les Demandes de Retrait de Fonds (DRF N° 0011, DRF N° 0014, DRF N° 0016, DRF N° 0018 & DRF N° 0020) ont fait effectivement l'objet de paiement au cours de cette année pour un montant global de 2 707 598 641 F CFA.

## VII. SITUATION DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

À la fin de l'exercice 2018, la réalisation globale est de 2 839 352 728 F CFA d'une prévision semestrielle de 2 915 742 886 F CFA, soit un taux de réalisation de 97,38%. Le financement des activités au titre de ce semestre a été réalisé sur deux fonds :

- ✓ le Fonds FIDA dont le montant est de 2 687 881 524 F CFA soit 108,29% comme taux d'exécution annuel ;
- ✓ la contrepartie du Gouvernement de la somme de 5 011 204 F CFA soit 1,49% comme taux d'exécution annuel.
- ✓ les bénéficiaires de la somme de 146 460 000 F CFA soit de 149,31% comme taux d'exécution annuel.

### 7.1 Exécution budgétaire par composante

Tableau 7 et Fig. 2 en annexe synthétisent les résultats de l'exécution budgétaire par composante. L'analyse globale des réalisations du 01/01/2018 au 31/12/2018 au niveau de chaque composante donne les résultats ci-après :

#### **Composante A : Appui à la production et productivité rizicole et activités complémentaires**

Le montant de réalisation de la composante A est de 977 291 719 F CFA sur la prévision annuelle de 1 372 614 008 F CFA soit un taux de 71,20%.

#### **Composante B : Appui à la valorisation des productions et accès au marché**

La réalisation de la composante B est de 1 207 079 856 F CFA sur une prévision annuelle de 791 829 600 F CFA soit un taux semestriel de 152,44%.

#### **Composante C : Coordination et renforcement institutionnel**

La réalisation de cette composante est de 654 981 153 F CFA sur une prévision annuelle de 751 299 278 F CFA soit 87,18% de taux de décaissement annuel.

### 7.2 Exécution budgétaire par catégorie de dépenses

Pour l'analyse de l'exécution budgétaire par catégories de dépenses, il convient de se référer au tableau 6 et figure 1 en annexe qui fait la synthèse des réalisations par catégorie de dépenses.

L'analyse des réalisations s'établit comme suit :

### Génie Rural

Cette catégorie de dépenses connaît une réalisation de 1 652 293 406 F CFA sur une prévision annuelle de 1 442 864 912 F CFA soit à 114,51% .

### Subvention et Dons

Cette catégorie de dépenses connaît une réalisation de 109 132 990 F CFA sur une prévision annuelle de 127 515 000 F CFA soit 85,58%.

### Équipements et matériels

La réalisation de cette catégorie de dépense est de 49 382 777 F CFA sur une prévision annuelle de 73 714 816 F CFA soit un taux de 66,99%.

### Consultants

Cette catégorie de dépenses connaît une réalisation de 651 141 397 F CFA pour une prévision annuelle de 662 452 358 F CFA soit 98,29% de taux d'exécution annuel.

### Formations et ateliers

Cette catégorie de dépenses totalise une réalisation de 60 765 138 F CFA pour une prévision annuelle de 200 010 000 F CFA soit 30,38% de taux d'exécution annuel

### Frais de fonctionnement

Cette catégorie de dépenses totalise une réalisation de 77 978 328 F CFA pour une prévision annuelle de 228 005 800 F CFA soit 34,20% de taux d'exécution annuel.

### Salaires et Indemnités

Elle totalise une réalisation de 97 282 295 FCFA pour une prévision semestrielle de 90 590 000 F CFA soit 131,72% de taux d'exécution annuel.

## **7.3 Exécution budgétaire par nature de dépenses**

Pour l'analyse de l'exécution budgétaire par nature de dépenses, il convient de se référer au tableau 8 et à la figure 3 en annexe. Pour l'essentiel, l'analyse s'établit comme suit :

### Investissements

L'investissement connaît une réalisation de 2 522 715 708 F CFA sur une prévision annuelle de 2 506 557 086 F CFA soit un taux de réalisation de 100,64%.

### Coûts récurrents

Les coûts récurrents connaissent une réalisation de 316 637 020 F CFA sur une prévision annuelle de 409 185 800 F CFA soit un taux de réalisation de 77,38%.

## **7.4 Exécution budgétaire par source de financement**

Pour l'analyse de l'exécution budgétaire par source de financement, il convient de se référer au tableau 9 et figure 4 en annexe. Pour l'essentiel, ce tableau indique que toutes les dépenses effectuées au cours de ce PTBA s'élèvent à 2 839 352 728 F CFA. Le FIDA a financé à la somme de 2 687 881 524 F CFA soit 108,29% de taux de réalisation annuelle, la contrepartie du Gouvernement est de 5 011 204 F CFA soit 1,49% de taux de décaissement annuel pour une prévision annuelle de 335 504 587 F CFA et les bénéficiaires à la somme de 146 460 000 F CFA soit 149,31% pour une prévision semestrielle de 98 089 485 F CFA.

## **7.5 Situation des comptes bancaires du projet**

L'analyse de la situation des comptes bancaires gérés par l'Unité de Coordination du Projet s'établit comme suit :

### **7.5.1 Situation du compte spécial**

Au cours de la période sous analyse, le compte spécial a reçu cinq virements pour un montant total de 1 573 154 726 F CFA correspondant aux DRF N° 0011, DRF N° 0014, DRF N° 0016, DRF N° 0018 DRF N° 0020.

Le solde du compte selon le relevé bancaire jusqu'au 31/12/2018 est crédité de la somme de **52 914 550 F CFA**.

Les fonds reçus ont permis de faire face en partie aux dépenses de fonctionnement et aux activités exécutées au cours du semestre.

### **7.5.2 Situation du compte contrepartie de l'État**

Jusqu'au 31/12/2018, le compte de contrepartie de l'État a bénéficié des recettes de la vente de DAO à hauteur **6 561 375 F CFA**.

Le solde du compte contrepartie de l'État selon le relevé bancaire jusqu'au 31/12/2018 est crédité de la somme de **1 550 171 F CFA**.

## **7.6 Conclusion sur la gestion de deuxième semestre**

Au cours cet exercice, de façon générale, le montant total décaissé s'élève de 2 839 352 728 F CFA soit 97,38% selon la prévision annuelle de 2 915 742 886 F CFA

## **VIII. CONCLUSION GÉNÉRALE**

L'exercice 2018 s'est concentré sur les activités structurantes. Certaines réalisations structurantes prévues dans le cadre de l'exercice 2018 notamment, l'aménagement des trois (3) basfonds de 95 ha et de six (6) rizières de mangroves de type traditionnel de 2 951 ha ont été achevées.

La réhabilitation de 32,3 km de pistes et l'aménagement de 1 728 ha de mangroves de type moderne sont en cours d'achèvement avec un taux de réalisation respectivement de 81,22% et de 95%.

Au cours de cette année, les réalisations financières du projet s'élèvent à 2 839 352 728 F CFA soit un taux d'exécution financière estimé à 97,38% contre 80,82% de réalisation physique.

Par ailleurs, les ONG partenaires ont poursuivi avec les actions d'ingénierie sociale en vue de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires.

Au prochain PTBA, l'UCP/PADES a pris toutes les dispositions nécessaires afin mettre en exploitation les rizières réhabilitées et achevées.



**ANNEXES**

**Tableau 4 : Aperçu sur les recommandations de mission de la revue à mi-parcours - octobre 2018**

Activités structurantes	Sous activités structurantes	Total nbre	Octobre 2018		
			Réalisé Nbre	En cours Nbre	Non entamé Nbre
AS 1: Ouvrage hydro-agricoles et valorisation	Ingénierie sociale autour des ouvrages hydroagricoles - Genre <b>AGROÉCONOMISTE</b>	15	3	8	4
AS 1/AS 2: Aménagements et Pistes	Réhabilitation des ouvrages : Mangrove, Basfonds et Pistes – <b>GÉNIE CIVILE</b>	5	2	3	0
AS 3: Coordination et gestion	Renforcement de capacités des multiplicateurs de semences <b>AGRONOME</b>	3	0	3	0
	Élaboration et l'opérationnalisation d'une stratégie de sortie du projet et renforcement de capacité - <b>COORDINATION</b>	6	3	2	1
	Élaborer et mettre en œuvre un plan de transfert des compétences à l'Assistant S/E - <b>CONSULTANTS</b>	1	1	0	0
	Mettre en place un fichier actif des prestataires de services - <b>RAF</b>	5	3	2	0
	Suivi et Évaluation - <b>RSE</b>	5	1	2	2
<b>Total général</b>		<b>40</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>7</b>

**Tableau 5 : Synthèse du niveau d'exécution des activités**

code	Composante/ sous composante / volet / Produit	Indicateur	Unité	Coef	Exercice 2018		
					Prévision	réalisation	Taux (%)
A110102	Les ONG prestataires de service contractualisées	contrats signés	nbre	6	5,00	5,0	100%
A110103	Conventions avec les services techniques d'état signé	contrats signés	nbre	5	3,00	3,0	100%
A110202	Séances d'information/concertation avec des OP réalisé	conventions signée	pers.j	4	200,00	150,0	75%
A110301	Étude technique type traditionnel réalisé	rapport d'étude	nbre	6	5,00	5,0	100%
A110302	Étude technique type moderne réalisé	rapport d'étude	nbre	4	1,00	1,0	100%
A110303	Étude de faisabilité à Can réalisé	rapport d'étude	nbre	2	1,00	1,0	100%
A110304	Étude APD à Can réalisé	rapport d'étude	ha	5	1 200,00	0,0	20%
A110305	Étude d'impact environnemental réalisé	rapport d'étude	ff	4	1,00	0,0	0%
A110401	Les comités de gestion de périmètres mis en place	rapport d'étude	pers.j	4	180,00	180,0	100%
A110402	Mangrove type traditionnel réhabilité	procès-verbal de réception de bolanha mangrove	ha	6	2 931,00	2931,0	100%
A110403	Mangrove type moderne réhabilité	procès-verbal de réception de bolanha mangrove	ha	7	1 500,00	1728,0	95%
A110404	Bas-fonds réhabilité	procès-verbal de réception de bolanha bas-fonds	ha	5	50,00	95,0	190%
A110405	Périmètres maraichers aménagée	procès-verbal de réception de bolanha basfonds	ha	6	10,00	23,0	230%
A110406	Supervision des travaux assurée par IGR et ATI	procès-verbal de réception de périmètres maraichers	pers.m	2	6,00	8,0	133%
A110501	Études techniques des bassins versants réalisé	rapport d'étude	nbre	5	1,00	1,0	100%
A110601	Assistant Technique National en infrastructures recruté	contrat signé	pers.m	3	6,00	6,0	100%
<b>A1</b>	<b>Réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles</b>			<b>74</b>			<b>104,89%</b>
A210101	Convention avec l'INPA établie	convention signée	nbre	5	1,00	1,0	100%
A210102	Semences de riz de base produits	xxx tonnes de semences de base produits (stockés /distribués)	t	5	37,50	13,0	35%
A210106	Multiplicateurs de semences de riz sensibilisés	xx multiplicateurs de semences formés	réunion	1	1,00	1,0	100%
A210107	Agriculteurs multiplicateurs formés	xx multiplicateurs de semences sensibilisation	session	1	2,00	1,0	50%
A210301	Producteurs appuyés en semences de riz améliorées	xx producteurs ont reçu semences de riz	tonne	6	100,00	56,0	56%
A210302	Producteurs appuyés en semences d'espèces maraichères	xx producteurs ont reçu semences d'espèces maraicher	kg	2	207,50	106,0	51%
A210303	Producteurs appuyés en engrais	xx producteurs ont reçu engrais	tonne	2	19,00	19,0	100%
A210304	Producteurs appuyés en produits phytosanitaires	xx producteurs ont reçu produits agro-pharmaceutiques	litres	2	380,00	211,00	56%
A210306	Producteurs appuyés en kits maraicher	xx producteurs ont reçu les kits maraicher	lot	3	300,00	341,00	114%
A210406	Visites de champs école organisées échelle nationale	xx visites d'échange organisées à échelle nationale	nbre	1	1,00	1,0	100%
A210408	Programme de formation élaboré	xx sessions de formation réalisées	session	3	10,00	10,0	100%
A220104	L'approvisionnement de vaccins assuré	doses de vaccins approvisionnées	dose	2	125 000,00	125000,0	100%

## Rapport annuel d'Activités du PADES 2018


code	Composante/ sous composante / volet / Produit	Indicateur	Unité	Coef	Exercice 2018		
					Prévision	réalisation	Taux ( %)
A230101	Les leaders des OPB sont formés	rapport de formation	pers.j	4	20,00	15,00	75%
A230102	Le memento du leader est édité	exemplaires de memento		2	500,00	500,00	100%
A230104	La structuration des OPB est accompagnée	mission	nbre	2	12,00	16,0	133%
A230201	La plateforme est formée aux fonctions organisationnelles et la tenue des instances est appuyée	rapport de formation plateforme Nationale	pers.j	2	20,00	5,00	25%
A230202	Le diagnostic organisationnel et élaboration plan de développement organisationnel est appuyé	Rapport diagnostic et élaboration plan de développement organisationnel	pers.j	2	20,00	4,00	20%
A230204	Les émissions radio sont appuyées	convention signée	nbre	2	20,00	20,00	100%
A230205	Supervision, suivi et appui au programme FIDA sont assurés	rapport de mission	nbre	3	60,00	6,00	10%
A230208	Les rencontres avec les partenaires techniques et prestataires de services sont tenus	rapport de rencontre	nbre	2	12,00	11,00	92%
A240101	Conventions avec les Directions régionales pour appui-conseils établies	nbre de conventions établies	nbre	5	3,00	3,00	100%
A240102	Prestataires privés pour appui-conseil contractualisés	nbre de prestataires contractualisés	nbre	5	20,00	3,00	15%
A240203	Chambre de froide mise en place	nbre de camera de froide installée	nbre	3	1,00	0,90	90%
A240206	Motopompes acquis	nbre de motopompes	nbre	5	2,00	-	0%
A240207	Études de réhabilitation du labo et du magasin réalisés	rapport d'étude de réhabilitation de labo et magasin	nbre	2	1,00	1,00	100%
A240208	Laboratoire de semences et magasin de stockage de semences réhabilités	laboratoire de semences	nbre	5	1,00	1,00	100%
A240209	Activités d'INPA suivies	rapports de missions de suivi	nbre	3	24,00	12,00	50%
A240210	Étude de réhabilitation de périmètre des périmètres rizicole réalisé	rapport d'étude de réhabilitation de périmètre	ff	4	1,00	1,00	100%
A240211	xx ha de périmètre des périmètres rizicole réhabilité	rapport de réhabilitation (réhabilitation réalisée)	ha	6	43,00	-	0%
A240304	La supervision du projet par les Direction centrales assuré	missions de supervision réalisées par Directions Centrales	nbre	3	8,00	5,00	63%
A240305	La supervision du projet par les Direction régionales assuré	missions de supervision réalisées par Directions Régionales	nbre	4	36,00	5,00	14%
A240306	Fournir les facteurs de production en appui à la campagne agricole 2017/2018	Facteurs fournis	tonnes				
A240307	Les visites d'échanges à l'intérieur du pays appuyées	nbre de visites à l'intérieure appuyées	nbre	1	1,00	-	0%
<b>A2</b>	<b>Exploitation des sites et développement des activités complémentaires</b>			<b>98</b>			<b>62,47%</b>
<b>A</b>	<b>Appui à la production et productivité rizicole et activités complémentaires</b>			<b>172</b>			<b>80,72%</b>
B110204	Bénéficiaires formés sur les techniques de transformation, hygiène, conservation des produits	xx sessions de formations sur les techniques de transformation, hygiène, conservation réalisées	session	2	5,00	-	0%
<b>B1</b>	<b>Promotion des métiers connexes et des activités de valorisation</b>			<b>2</b>			<b>0,00%</b>
B210101	Convention signé avec DGIT	convention signé	nbre	4	1,00	1,00	100%
B210103	Cabinet de contrôle des travaux contractualisé	contrat signé	km	6	32,30	25,84	80%
B210104	Travaux des pistes réalisées	procès-verbal de réception des pistes	km	8	32,30	32,30	81%
B210106	CITEP équipée avec petits matériels	facture d'acquisition	Kits	2	8,00		50%
B210201	Étude de faisabilité pour acquisition du ferry réalisé	rapport d'étude	nbre	3	1,00	1,00	100%
<b>B2</b>	<b>Construction et réhabilitation de pistes rurales</b>			<b>23</b>			<b>83,90%</b>
<b>B</b>	<b>Appui à la valorisation des productions et accès au marché</b>			<b>23</b>			<b>83,90%</b>
C110101	DAO les travaux de bâtiment additionnel élaboré	DAO élaboré	nbre	2	1,00	1,0	100%
C110102	Rapport d'étude du Forage fournit	étude géographique réalisé	nbre	2	1,00	1,0	100%
C110103	Forage réalisé	forage réalisé	nbre	3	1,00	1,0	100%
C110104	Clôture du siège	clôture du siège construite	nbre	2	1,00	1,0	100%
C110105	Panneaux solaire	panneaux solaires installés	ff	4	1,00	1,0	100%
C110106	Bâtiment additionnel	bâtiment additionnel construit	nbre	3	1,00	1,0	100%
C120102	Organiser les sessions du Comité de Pilotage du Projet	sessions organisées	nbre	2	1,00	1,0	100%
C120103	Tenir forum d'orientation sur le projet	Forum réalisé	nbre	2	2,00	0,0	0%
C120105	Conduire les ateliers de consolidation du PTBA au niveau région	ateliers conduits	nbre	2	3,00	3,0	100%
C120106	Conduire les ateliers d'élaboration du PTBA au niveau central	ateliers conduits	nbre	1	1,00	1,0	100%
C120107	Suivre/superviser les activités par l'UCP	missions réalisées	nbre	2	4,00	4,0	100%
C120109	Tenir un comité du suivi technique sur le projet	réunions réalisées	nbre	3	12,00		0%
C120110	Assurer l'appui d'assistant technique international au service suivi et évaluation	ATI appuyé au S&E	pers.m	5	8,00	5,8	72%
C120201	Assistant Technique International (ATI) en planification recruté	contrat signé	pers. m	5	9,00	6,8	75%

code	Composante/ sous composante / volet / Produit	Indicateur	Unité	Coef	Exercice 2018		
					Prévision	réalisation	Taux ( %)
C120202	Assistant Technique International (ATI) en comptabilité, administration et finances recruté	contrat signé	pers. m	4	3,00	3,0	100%
C120203	Assistant Technique International (ATI) en passation du marché recruté	contrat signé	pers. m	3	1,00	0,0	0%
C120204	Assistant Technique International pour TOM2PRO recruté	contrat signé	pers. m	3	1,00	1,0	100%
C140101	Matériel informatique et mobilier de bureau	matériel et mobilier acquis	nbre	4	1,00	1,0	100%
C140102	Mobiliers de chambre	meubles acquis	nbre	2	1,00	1,0	100%
C150103	Réaliser l'enquête annuelle sur les résultats (EAR)	enquête réalisée	nbre	5	1,00	0,0	0%
C150105	Réaliser les collectes périodiques des données pour le système de suivi-évaluation	données collectées	pers. trimestre	3	272,00	272,0	100%
C150201	Organiser les missions diverses de terrain du suivi-évaluation	missions organisées	ff	2	1,00	1,00	100%
C150202	Assurer les audits techniques externes du projet	missions assurées	nbre	3	1,00	0,0	0%
C150203	Organiser les missions de supervision conjointe Gouv-FIDA	missions organisées	nbre	2	2,00	1,0	50%
C150204	Organiser les missions de revue à mi-parcours du projet	mission organisée	nbre	5	1,00	1,0	100%
C150208	Organiser les ateliers de restitution pour les résultats de données	ateliers réalisés	nbre	2	4,00	1,0	25%
C150209	Organiser des missions d'extension du PADES pour Bijagós	mission réalisée	ff	3	1,00	1,0	100%
C150301	Rapport d'audit financier et comptable du projet	audit financier et comptable assurés	nbre	3	1,00	1,0	100%
C160101	Renforcer les capacités de l'UCP à l'étranger	capacités renforcées	pers.m	5	5,00	3,0	60%
C160102	Renforcer les capacités de l'UCP dans le pays	capacités renforcées	pers.m	3	20,00	10,0	50%
C160103	Former les acteurs (DRA, CDIT e ONG) impliqués en matières de suivi-évaluation	acteurs formés	session	2	3,00	3,0	100%
<b>C1</b>	<b>Coordination et suivi-évaluation</b>			<b>92</b>			<b>73%</b>
C210102	Les centres d'alphabétisation sont créés	rapport de mission	nbre	1	1,00	1,0	100%
C210103	Les CDIT sont formés sur diverses thématiques (Élaboration des dossiers de DMP, Passation de marchés, S&E, IEC, Audit, Genre, Groupement de femmes et J	rapports de formations	session	4	5,00	2,0	40%
C210106	La campagne de commémoration de la journée mondiale de la femme et journée internationale de la femme rurale organisée	procès-verbaux	pers.j	2	300,00	77,0	26%
C210107	Les centres d'alphabétisation sont animés	attestation de formation	pers.j	4	100,00	351,0	351%
C210202	Soutenir réunions de restitution des études APS/APD, DAO		nbre	2	5,00	0,0	0%
C210203	Les réunions de restitutions des études APP/APD/DAO sont soutenues	réunions soutenues	nbre	3	8,00	5,0	63%
C210204	Un ATI de court terme est contractualisé	Contrat signé		2	1,50	1,5	100%
<b>C2</b>	<b>Mise à Échelle des CDIT</b>			<b>18</b>			<b>116,82%</b>
<b>C</b>	<b>Coordination et renforcement institutionnel</b>			<b>110</b>			<b>80,34%</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>TOTAL PROJET</b>			<b>305</b>			<b>80,82%</b>

Tableau 6 : Situation de l'exécution budgétaire par catégorie de dépenses

Code	Libellé	PTBA 2018		
		Réalisations	Prévision	%
I	Génie rural	1 652 293 406	1 442 864 912	114,51%
II	Subventions et dons	109 132 990	127 515 000	85,58%
III	Équipements et matériels	49 382 777	73 714 816	66,99%
IV	Consultants	651 141 397	662 452 358	98,29%
V	Formation et ateliers	60 765 138	200 010 000	30,38%
VI	Coûts de fonctionnement	77 978 328	228 005 800	34,20%
VII	Salaires et indemnités	238 658 692	181 180 000	131,72%
	Total	2 839 352 728	2 915 742 886	97,38%


Figure 1 : Exécution budgétaire par catégorie de dépenses

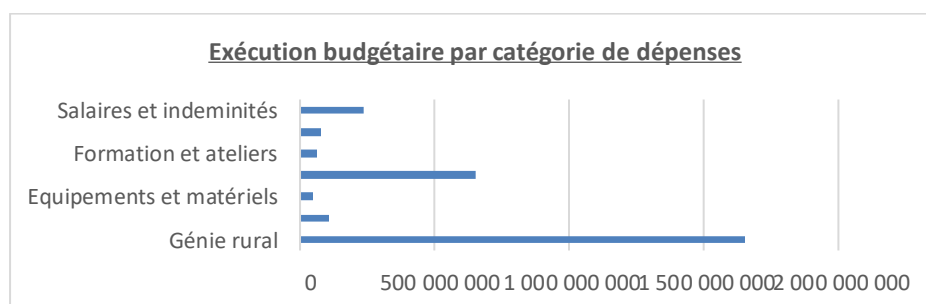

**Tableau 7 : Situation de l'exécution budgétaire par composante**

Code	Libellé	PTBA 2018		
		Réalisations	Prévision	%
A	APPUI PRODUCTION & PRODUCTIVITÉ RIZICOLE & ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES	977 291 719	1 372 614 008	71,20%
B	APPUI VALORISATION PRODUCTIONS ET ACCÈS AU MARCHÉ	1 207 079 856	791 829 600	152,44%
C	COORDINATION ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL	654 981 153	751 299 278	87,18%
Total		2 839 352 728	2 915 742 886	97,38%


**Figure 2 : Exécution budgétaire par composante**

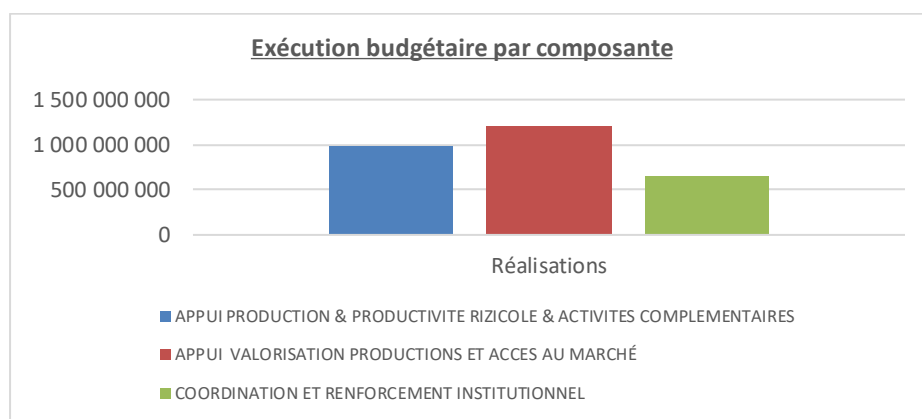

**Tableau 8 : Situation de l'exécution budgétaire par nature de dépenses**

Nature de dépenses	PTBA 2018		
	Réalisations	Prévision	%
Coûts récurrents (Fonctionnements)	316 637 020	409 185 800	77,38%
Investissements	2 522 715 708	2 506 557 086	100,64%
Total	2 839 352 728	2 915 742 886	97,38%


**Figure 3 : Exécution budgétaire par nature de dépenses**

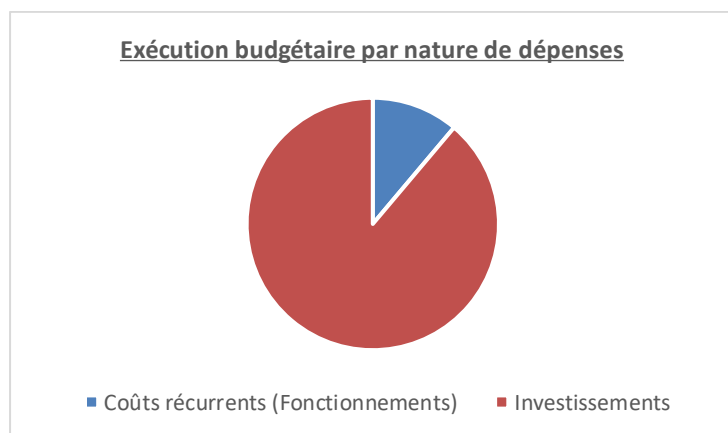

**Tableau 9 : Situation de l'exécution budgétaire par source de financement**

Source de financement	PTBA 2018		
	Réalisations	Prévision	%
Bénéficiaires	146 460 000	98 089 485	149,31%
FIDA	2 687 881 524	2 482 148 814	108,29%
Gouvernement	5 011 204	335 504 587	1,49%
<b>Total</b>	<b>2 839 352 728</b>	<b>2 915 742 886</b>	<b>97,38%</b>

**Figure 4 : Exécution budgétaire par source de financement**

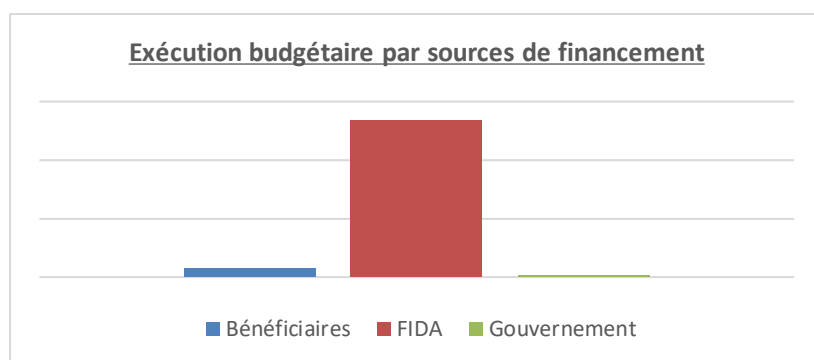

**Tableau 10 : Nombre de bénéficiaires occupants 23 ha de périmètres horticoles aménagés**

Item	Région	Total de puits	Total de Superficie (ha)	Nombre de bénéficiaires		
				Total	F	J
1	Bolama/Bijagós	18	9	202	202	82
2	Quinara	21	10,5	554	554	297
3	Tombali	7	3,5	196	196	117
<b>Total</b>		<b>46</b>	<b>23</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>496</b>

**Tableau 11 : Stockage et distribution de semences de riz améliorées**

Région	Secteur	Site	DÉPÔT (kg)	TOTAL DISTRIBUE (kg)	Quantité de riz (kg) - Mangrove				Quantité de riz (kg) - Basfonds				Nombre de paysans bénéficiaires				
					Total	F	H	J	Total	F	H	J	Total	F	H	J	
	Empada	TOTAL EMPADA	5 750	4 702	2 774	1 599	1 175	-	1 928	1 328	600	-	197	126	71	-	
		Rizières de Bissassema	7 960	4 980	4 980	470	4 510	1 180				-	218	9	209	59	
	Tite	TOTAL TITE	7 960	4 980	4 980	470	4 510	1 180	-	-	-	-	218	9	209	59	
	TOTAL QUINARA		13 710	9 682	7 754	2 069	5 685	1 180	1 928	1 328	600	-	415	135	280	59	
Tombali	Bedanda	Rizières de Bedanda	6 000	6 000	6 000	366	5 634	505				-	128	8	120	11	
		Rizières de Caboxanque	17 050	17 000	17 000	650	16 350						313	13	300	-	
		Multiplicateur de semences	1 200	1 200													
		TOTAL BEDANDA	24 250	24 200	23 000	1 016	21 984	505	-	-	-	-	441	21	420	11	
	Catió	Rizières de Cubumbam	6 360	6 210	6 210	200	6 010	2 350				-	130	4	126	50	
		Rizières de Gandua-Incomene	6 000	5 931	5 931	700	5 231	1 496				-	186	26	160	50	
		Timbo 1 bas-fond	1 500	1 257					1 257	711	546	399	85	52	33	30	
		TOTAL CATIO	13 860	13 398	12 141	900	11 241	3 846	1 257	711	546	399	401	82	319	130	
TOTAL TOMBALI		38 110	36 398	35 141	1 916	33 225	4 351	1 257	711	546	399	842	103	739	141		
TOTAL GENERAL		51 820	46 080	42 895	3 985	38 910	5 531	3 185	2 039	1 146	399	1 257	238	1 019	200		

**Tableau 12 : Le rendement de riz sur chaque site aménagé**

N°	Site	Superficie aménagée (ha)		Superficie mise en valeur (ha)		Production du riz par tonnes (T)				Total
		Basfonds	Mangrove	Basfonds	Mangrove	Rendement Basfonds (T/ha)	Rendement Mangrove (T/ha)	Production Basfonds	Production Mangrove	
1	Caboxanque		1 884	-	1 641,86	-	2,25	-	3 694,19	3 696,44
2	Bedanda		371	-	115,10	-	2,43	-	279,69	282,12
3	Cubumbam		494	-	386,02	-	1,47	-	567,45	568,92
4	Darsalame	42	44	13,74	23,15	1,57	1,91	21,57891	44,22	46,13
5	Madina-Gantumane	30	32	12,67	35,28	1,91	-	24,19729	-	26,11
7	Gandua-Incomene		351	-	265,11	-	1,23	-	326,09	327,32
8	Bissassema-Nhala		1 377	-	255,33	-	1,32	-	337,04	338,36
9	Timbo 1	23		16,92	-	1,50	-	25,38	-	26,88
<b>TOTAL</b>		<b>95</b>	<b>4 553</b>	<b>43,33</b>	<b>2 721,86</b>	<b>1,64</b>	<b>1,93</b>	<b>71</b>	<b>5 249</b>	<b>5 312</b>

**Tableau 13 : Stockage et distribution de semences maraichers par site aménagé**

N°	Région	Secteur	Site	Superficie aménagée (ha)	Semence reçue	Bénéficiaires			
						Total	F	J	
1	TOMBALI	Bedanda	Caboxanque	1	7 100	60	60	44	
			Bedanda	1	5 400	48	48	18	
		Catió	Catussam	1,5	4 750	88	88	55	
<b>Total Tombali</b>				<b>3,5</b>	<b>17 250</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>117</b>	
2	QUINARA	Tite (Bissassema)	Murcande	1	4 900	45	45	26	
			Embaixada	2	5 100	80	80	53	
			Nte de Bugue	1,5	7 450	72	72	29	
			Khazi	1,5	7 350	43	43	22	
		Tite	Djabada Porto	2	7 100	107	107	74	
			Enxude	0,5	800	57	57	27	
		<b>Sub-Total</b>			<b>8,5</b>	<b>32 700</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>231</b>
		Empada	Madina de Baixo	1	4 850	54	54	22	
Gã-Cumba	1		5 800	96	96	44			
<b>Sub-Total</b>			<b>2</b>	<b>12 650</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>66</b>		
<b>Total Qunara</b>				<b>10,5</b>	<b>45 350</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>297</b>	
3	BOLAMA	Bolama	Gã-Bacar	1,5	6 200	37	37	14	
			São João	2	7 200	48	48	21	
			Wato	1	5 150	39	39	12	
			Madina	1,5	6 250	32	32	13	
			Cabopa	1	4 950	11	11	6	
			Lala Mancanha	2	7 250	35	35	16	
<b>Total Bolama</b>				<b>9</b>	<b>37 000</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>82</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>23</b>	<b>99 600</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>496</b>	
<b>Semences en kilogrammes</b>					<b>100</b>				

Obs. : 106 kg de semences maraichères ont été acquis contre 100 qui ont été distribuées

**Tableau 14 : Répartition des apprenants par niveau des centres d'alphabétisation**

Région	Secteur	Centre	Niveau 1							Niveau 2							Total secteur
			Admis		Redoublants		Abandons		Total	Admis		Redoublants		Abandons		Total	
			F	H	F	H	F	H		F	H	F	H				
Tombali	Bedanda	Guiledje	0	0	0	0	23	2	25	15	1	5	1	2	1	25	50
		Catió	Gandua/Estrada	21	0	0	0	6	0	27	26	0	0	0	0	0	
	Catussam		11	3	0	0	9	1	24	20	1	0	0	10	1	32	
Quínara	Tite	Djabada Porto	11	0	2	0	12	0	25	15	0	1	0	5	0	21	115
		Nova Sintra	12	0	12	0	3	0	27	9	0	5	0	3	0	17	
		Bissassema	0	0	0	0	19	0	19	0	0	0	0	6	0	6	
	Empada	Biassa	39	2	5	0	0	0	46							0	46
Bolama/ Bijagós	Bolama	São João	17	10	2	1	3	1	34	24	12	0	0	2	3	41	75
<b>Total Général</b>			<b>111</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>227</b>	<b>109</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>168</b>	<b>395</b>
			126		22		79					123		12		33	

**Tableau 15 : Membres de CGB par site rizicole aménagé**

N°	Rizière	Secteur	Région	N° membres du CGB		Total
				M	F	
1	Caboxanque	Bedanda	Tombali	3	3	6
2	Bedanda	Bedanda	Tombali	5	2	7
3	Cubumba de Mato	Catió	Tombali	4	3	7
4	Darsalame	Empada	Quínara	2	3	5
5	Madina-Gantumane	Empada	Quínara	15	10	25
6	Can	Empada	Quínara	4	3	7
7	Timbo 1	Catió	Tombali	3	4	7
8	Mansane	Catió	Tombali	5	3	8
9	Gandua Incomene	Catió	Tombali	4	3	7
10	Flora	Tite	Quínara	4	3	7
11	Quibil-Ilheu d'Infanda	Catió	Tombali	5	2	7
12	Bissassema -Nhala	Tite	Quínara	7	6	13

Obs. : La rizière de Can n'a pas encore aménagé

**Tableau 16 : Nombre des Pistes réhabilitées**

Item	Pistes	Longueur	Jan-Oct. 2018	Nov.-Déc. 2019	Secteur	Région	Total par région
		Km	%	%			
1	Gandua-Incomene	6	39,96%	98%	Catió	Tombali	13,9
2	Gandua-Tchuguê	7,9	53,96%	97%			
3	Aidará-Can	4,9	56,76%	85,97%	Empada	Quínara	18,4
4	Tite Bissassema-barrage	13,5	50,37%	90%	Tite		
<b>Sous-Total</b>		<b>32,3</b>	<b>50,37%</b>	<b>81,22%</b>	<b>Pistes réhabilitées</b>		
5	L33-Caboxanque	11,7			Bedanda	Tombali	En cours
<b>TOTAL</b>		<b>44</b>					

Obs. : La piste L33-Caboxanque en cours de réhabilitation dans le cadre de Fonds OFID en 2019



**Tableau 17 : Nombre des éleveurs recensés par secteur de la ZIP**

Région	secteur	Nombre d'éleveur/espèce						Nombre d'éleveur		
		TOTAL	Volaille	Caprin	Ovin	Porc	Autre	F	H	J
Quinara	Empada	81	60	18	7	5	4	30	51	32
	Tite	93	47	23	0	19	18	32	61	59
	<b>TOTAL QUINARA</b>	<b>174</b>	<b>107</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>112</b>	<b>91</b>
Tombali	Catió	55	35	10	0	3	9	23	32	26
	Bedanda	69	48	14	1	7	10	23	46	14
	<b>TOTAL TOMBALI</b>	<b>124</b>	<b>83</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>78</b>	<b>40</b>
Bolama/ Bijagós	Bolama	74	58	22	0	1	5	33	41	24
	<b>TOTAL BOLAMA/ BIJAGÓS</b>	<b>74</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>372</b>	<b>248</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>141</b>	<b>231</b>	<b>155</b>

**Tableau 18 : Nombre des paysans par site et les superficies mise en valeur**

Région	Secteur	Rizière	Type de Rizière	Superficie aménagée (ha)	Superficie mise en valeur (ha)	Nbre des agriculteurs			
						Total	M	F	Jeune
TOMBALI	CATIÓ	Timbo I	Basfonds	23	16,92	94	17	77	7
		<b>Sous-Total</b>			<b>16,92</b>	<b>94</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>7</b>
		Gandua-Incomene	Mangrove type Moderne	351	265,11	259	155	104	107
		Mansane	Mangrove type Traditionnel	126	-	197	108	89	30
		Cubumba	Mangrove type Traditionnel	494	386,02	134	130	6	77
		<b>Sous-Total</b>			<b>651,14</b>	<b>590</b>	<b>393</b>	<b>199</b>	<b>214</b>
	BEDANDA	Bedanda	Mangrove type Traditionnel	371	115,10	116	110	6	99
		Caboxanque	Mangrove type Traditionnel	1 884	1 641,86	387	376	11	104
		<b>Sous-Total</b>			<b>1 756,96</b>	<b>503</b>	<b>486</b>	<b>17</b>	<b>203</b>
	<b>TOTAL TOMBALI</b>						<b>1 187</b>	<b>896</b>	<b>293</b>
QUINARA	TITE	Bissasema	Mangrove type Moderne	1 377	255,33	297	268	29	95
		<b>Sous-Total</b>			<b>255,33</b>	<b>297</b>	<b>268</b>	<b>29</b>	<b>95</b>
	EMPADA	Daresalame	Bas-fonds et Mangrove type traditionnel	32 et 44	36,89	113	64	49	16
		Madina-Gantumane	Bas-fonds et Mangrove type traditionnel	30 et 32	47,95	150	41	109	36
		<b>Sous-Total</b>			<b>84,84</b>	<b>263</b>	<b>105</b>	<b>158</b>	<b>52</b>
<b>TOTAL QUINARA</b>						<b>560</b>	<b>373</b>	<b>187</b>	<b>147</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2 765,20</b>	<b>1 747</b>	<b>1 269</b>	<b>480</b>	<b>571</b>

Obs. : La rizière de Mansane vient d'être aménagée et elle sera mise en valeur à partir de la campagne agricole 2019/2020
